# 新北市災害防救深耕第3期計畫
# 110年第2次四方工作會議

110年2月23日(星期二) 14時

# 議程

| | |
|---|---|
| 一、主席致詞 | (5分鐘) |
| 二、上次會議決議事項辦理情形報告 | (5分鐘) |
| 三、管制事項報告/災防辦報告事項 | (30分鐘) |
| 四、2月進度及3月預定工作報告 | (15分鐘) |
| 五、國際災例分析 | (10分鐘) |
| 六、110年市、區級防災社區推動暨認證說明會 | (15分鐘) |
| 七、臨時動議 | (5分鐘) |
| 八、主席結論 | (5分鐘) |

# 一、主席致詞

# 二、上次會議決議事項報告

# 上次會議決議事項辦理情形說明

1. **內政部韌性社區認證申請(如列管案107案)**

   -第1梯次、第2梯次、第3梯次認證資料送審進度

2. **109年區公所合作企業之參與防災工作成效(如列管案113案)**

   -30間績優企業訂於110年3月25日第1季災害防救會報表揚

3. **110年各區推動災害防救業務創新作為(如列管案115案)**

   -20案同意解除列管

4. **110市級防災(韌性)社區推動(如列管案116案)**

   -請相關局處於110年3月前完成招標採購及規劃推動期程

5. **110年區級(自主型)防災社區提報啟動月份(如列管案117案)**

   -請各區公所於2月19日前調查課程日期

# 三、管制事項報告

# 新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

| 編號 | 會議日期 | 管制事項 | 承辦單位 | 本次辦理情形 | 預計完成日期 | 管考意見 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 108年11月26日 | 內政部韌性社區認證申請 | 消防局<br>各區公所 | 1. 本市符合推動2年且具備2名防災士之防災社區為烏來區烏來里、新店區廣興里等2里，並申請內政部韌性社區標章認證。<br>2. 本市各區公所至少皆推動1處韌性社區認證。<br>3. 新店區廣興里、烏來區烏來里韌性社區申請：已通過1星標章認證申請，並於1月20日市政會議獻獎。<br>4. 規劃3梯次提報韌性社區認證，分別9月提報9區、10月提報7區、11月提報13區。<br>① 第1梯次：**萬里、林口、蘆洲已依據第二階段審查意見完成修正，另持續協助石門、三重及永和區公所修正認證資料。**<br>② 第2梯次、第3梯次：金山、八里、三芝及雙溪已依據第一階段審查意見完成補正，並上傳資料。 | 110年12月31日 | 持續列管 |

## 新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

| 編號 | 會議日期 | 管制事項 | 承辦單位 | 本次辦理情形 | 預計完成日期 | 管考意見 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 109年8月27日 | 109年區公所合作企業之參與防災工作成效 | 各區公所 | 已彙整本市既有84間合作企業參與本市防災工作具體績效，並從中遴選30間績優企業，訂於110年3月25日第1季災害防救會報表揚。 | 109年12月31日 | 持續列管 |
| 115 | 109年11月26日 | 110年各區推動災害防救業務創新作為 | 各區公所 | 1. 110年各區公所推動災害防救業務各項創新作為總計列管87案，截至目前為止，20案解除列管，持續列管67案。<br>2. 本次**提報解除列管共計16案**，經綜合管考意見後，**16案(項次1~16)建議解除列管**。<br>3. 截至2月20日為止，**新店、烏來區公所**尚未有辦理完成進度，請儘速辦理。<br>4. 有關本項列管案倘**貴公所需提報解除列管者，請檢附完整資料及辦理情形函文各權管局處，由各權管局處加註具體意見及建議是否解列或持續列管，再由該局處函文消防局**進行綜合管考，以利提報四方工作會議辦理。 | 110年12月31日 | 持續列管 |

# ★ 各區公所推廣創新作為進度表

| 區公所 | 列管件數 | 完成件數 | 完成進度 | 區公所 | 列管件數 | 完成件數 | 完成進度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋 | 3 | 2 | 66% | 泰山 | 3 | 1 | 33% |
| 三重 | 3 | 1 | 33% | 林口 | 3 | 1 | 33% |
| 中和 | 3 | 1 | 33% | 深坑 | 3 | 1 | 33% |
| 永和 | 3 | 1 | 33% | 石碇 | 3 | 1 | 33% |
| 新莊 | 3 | 1 | 33% | 坪林 | 3 | 2 | 66% |
| 新店 | 3 | 0 | 0 | 三芝 | 3 | 1 | 33% |
| 土城 | 3 | 1 | 33% | 石門 | 3 | 1 | 33% |
| 蘆洲 | 3 | 1 | 33% | 八里 | 3 | 2 | 66% |
| 樹林 | 3 | 1 | 33% | 平溪 | 3 | 1 | 33% |
| 汐止 | 3 | 1 | 33% | 雙溪 | 3 | 2 | 66% |
| 鶯歌 | 3 | 1 | 33% | 貢寮 | 3 | 1 | 33% |
| 三峽 | 3 | 1 | 33% | 金山 | 3 | 1 | 33% |
| 淡水 | 3 | 2 | 66% | 萬里 | 3 | 3 | 100% |
| 瑞芳 | 3 | 3 | 100% | 烏來 | 3 | 0 | 0 |
| 五股 | 3 | 1 | 33% | 總計 | 87 | 36 | 40% |

# ★ 各區公所推廣創新作為列管表(1/3)

| 項次 | 案號 | 區公所 | 列管事項 | 區公所回覆辦理情形 | 辦理期限 | 業管局處 | 業管局處意見 | 災防辦管考意見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 八里 | 儲備防疫物資，包含口罩、額溫槍、消毒酒精或乾洗手、肥皂或洗手乳等 | 已購買口罩、額溫槍及酒精等防疫物資，預計於1月25日前入庫並報送防災整備工作檢核表予以社會局。 | 於1/31前完成 | 社會局 | 建議解除列管 | 建議解除列管 |
| 2 | 11 | 三峽 | 建立區公所在職人員5公里緊急聯絡名冊(含Line群組) | 本所已建立在職人員5公里緊急聯絡名冊(含Line群組)，檢附該名冊及Line群組截圖1份 | 已完成 | 消防局 | 建議解除列管 | 建議解除列管 |
| 3 | 14 | 土城 | 建立區公所在職人員5公里緊急聯絡名冊(含Line群組) | 已於110年1月27日建置完成，並於1月28日新北土役字第1102413601號函報市府。 | 於1/28完成 | 消防局 | 建議解除列管 | 建議解除列管 |
| 4 | 17 | 中和 | 建立區公所在職人員5公里緊急聯絡名冊(含Line群組) | 於2/4函復消防局本所5公里緊急聯絡名冊及LINE群組佐證資料 | 於2/5前完成 | 消防局 | 建議解除列管 | 建議解除列管 |
| 5 | 20 | 五股 | 建立區公所在職人員5公里緊急聯絡名冊(含Line群組) | 已完成辦理，檢附完整資料函文權管局處。 | 於2/9前完成 | 消防局 | 建議解除列管 | 建議解除列管 |
| 6 | 32 | 石碇 | 建立區公所在職人員5公里緊急聯絡名冊(含Line群組) | 已於110/02/19提報緊急聯絡名冊及LINE群組佐證資料 | 於10/31前完成 | 消防局 | 建議解除列管 | 建議解除列管 |

# ★ 各區公所推廣創新作為列管表(2/3)

| 項次 | 案號 | 區公所 | 列管事項 | 區公所回覆辦理情形 | 辦理期限 | 業管局處 | 業管局處意見 | 災防辦管考意見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 38 | 坪林 | 建立區公所在職人員5公里緊急聯絡名冊(含Line群組) | 區公所在職人員5公里緊急聯絡名冊已建立完畢，且在職人員業已進入本所災害應變中心群組，本項辦理完畢。 | 於1/31前完成 | 消防局 | 建議解除列管 | 建議解除列管 |
| 8 | 39 | 坪林 | 儲備防疫物資，包含口罩、額溫槍、消毒酒精或乾洗手、肥皂或洗手乳等 | 本所業已於109年11月23日新增購置防疫物資於坪林區公所四樓頂樓本項辦理完畢。 | 於1/31前完成 | 社會局 | 建議解除列管 | 建議解除列管 |
| 9 | 42 | 板橋 | 儲備防疫物資，包含口罩、額溫槍、消毒酒精或乾洗手、肥皂或洗手乳等 | 自109年10月至110年1月已陸續購入口罩、額溫槍、消毒酒精、乾洗手、肥皂紙、用餐隔板。 | 於1/11前完成 | 社會局 | 建議解除列管 | 建議解除列管 |
| 10 | 50 | 泰山 | 建立區公所在職人員5公里緊急聯絡名冊(含Line群組) | 已完成5公里內人員名冊盤點及成立LINE群組刻正陸續邀請加入。 | 於2/5前完成 | 消防局 | 建議解除列管 | 建議解除列管 |
| 11 | 58 | 淡水 | 建立一所轄內學校人員或志工清冊，參與避難收容處所開設演練 | 本所於109年9月8日辦理颱洪複合式災害暨防災公園開設實兵演練已邀請淡江中學參與演練，並已建立淡江中學志工清冊。 | 於10/31前完成 | 教育局 | 建議解除列管 | 建議解除列管 |

# ★ 各區公所推廣創新作為列管表(3/3)

| 項次 | 案號 | 區公所 | 列管事項 | 區公所回覆辦理情形 | 辦理期限 | 業管局處 | 業管局處意見 | 災防辦管考意見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 62 | 深坑 | 建立區公所在職人員5公里緊急聯絡名冊(含Line群組) | 已建立區公所在職人員5公里緊急聯絡名冊(含Line群組) | 於2/26前完成 | 消防局 | 建議解除列管 | 建議解除列管 |
| 13 | 70 | 瑞芳 | 建立一所轄內學校人員或志工清冊，參與避難收容處所開設演練 | 本案已配合建置清冊，並辦理開設演練。 | 預計於2月底前完成 | 教育局 | 建議解除列管 | 建議解除列管 |
| 14 | 72 | 瑞芳 | 儲備防疫物資，包含口罩、額溫槍、消毒酒精或乾洗手、肥皂或洗手乳等 | 已配合填具「民生物資自儲情形一覽表」、「防災民生物資安全存量設算表」，並提供照片佐證。 | 預計於2月底前完成 | 社會局 | 建議解除列管 | 建議解除列管 |
| 15 | 75 | 萬里 | 儲備防疫物資，包含口罩、額溫槍、消毒酒精或乾洗手、肥皂或洗手乳等 | 完成最新版「民生物資自儲情形一覽表」與「防災民生物資安全存量設算表」填寫，並將相關防疫物資拍照。 | 於2/28前完成 | 社會局 | 建議解除列管 | 建議解除列管 |
| 16 | 86 | 鶯歌 | 建立區公所在職人員5公里緊急聯絡名冊(含Line群組) | 本案已完成，相關資料如附件，建請解列。 | 於1/31前完成 | 消防局 | 建議解除列管 | 建議解除列管 |

# 新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

| 編號 | 會議日期 | 管制事項 | 承辦單位 | 本次辦理情形 | 預計完成日期 | 管考意見 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 109年12月30日 | 110市級防災(韌性)社區推動 | 消防局<br>農業局<br>水利局<br>工務局<br>社會局<br>原民局<br>教育局<br>警察局 | 各局處推動數量共計12處，**請相關局處於110年3月前完成招標採購及規劃推動期程**，分別為：<br>1.**消防局**5處(新莊區合鳳里、八里區老阡里、萬里區北基里、中和區碧河里、深坑區昇高里)：<br>① **已於1月25日、29日分別拜訪新莊區合鳳里林里長、中和區碧河里賴里長；預計2月22日拜訪萬里區北基里鄧里長及八里區老阡里楊里長。**<br>② **另標案已於2月2日辦理開標、2月5日評選，預計2月24日議約，於2月完成招標。**<br>2.**水利局**3處(樹林區三龍里、汐止區保長里、瑞芳區龍安里)：<br>① **訪談社區參與意願已於2月完成。**<br>② **社區報名及現場規劃預計6月完成。**<br>③ **工作坊系列課程預計10月完成。**<br>④ **回報成果給消防局預計11月完成。**<br>2.**工務局**1處(淡水區翡冷翠社區)：目前尚在研擬規劃期程。 | 110年12月31日 | 持續列管 |

# 新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

| 編號 | 會議日期 | 管制事項 | 承辦單位 | 本次辦理情形 | 預計完成日期 | 管考意見 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 109年12月30日 | 110市級防災(韌性)社區推動 | 消防局<br>農業局<br>水利局<br>工務局<br>社會局<br>原民局<br>教育局<br>警察局 | 各局處推動數量共計12處，分別為：<br>6.**農業局**2處(新莊區雙鳳里、瑞芳區猴硐里)：**採購案辦理中，決標後將請協力廠商辦理。**<br>7.**社會局**1處(五股區六福里)：**已於1月22日拜訪公所區長討論防災社區規劃，另已完成招標簽核程序並上網公告，擬於3月底完成招標。**<br>8.**原民局**(輔導烏來區4處社區聯合複訓)：**烏來區既有防災社區複訓工作，刻正辦理招標作業。**<br>9.**教育局**：**持續配合其他局處遴選之防災社區中有學校者，督導該校配合防災社區推動，並給予相關資源補助。**<br>10.**警察局**：<br>① **依「新北市政府加速社區治安營造補助作業規範」之規定，配合消防局等單位持續推動。**<br>② **本府110年1月7日以新北府警預字第1100014740號函發水利局、工務局、農業局、原民局、社會局、消防局等機關，開始受理110年防災社區補助申請。** | 110年12月31日 | 持續列管 |

# 新北市深耕計畫四方工作會議主席裁(指)事項辦理情形管制表

| 編號 | 會議日期 | 管制事項 | 承辦單位 | 本次辦理情形 | 預計完成日期 | 管考意見 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 109年12月30日 | 110年區級(自主型)防災社區名單提報 | 各區公所 | 請各區公所擇定110年區級(自主型)防災社區擬定推動名單，並於110年1月29日前函報消防局，**目前28區皆已提報社區名單，並統計啟動及推動時間**。 | 110年12月31日 | 持續列管 |
| 118 | 109年12月30日 | 防災士公版教材規劃 | 消防局 | 1. 彙整並製作本市防災士公版教材，內容預計結合消防署全國教材、本市防災士培訓講師講義及消防局救護教官授課內容等多方位元素，整合為精裝本，以供授課學員課堂使用。<br>**2. 已研擬教材授權同意書，講師已提供公版教材初稿，目前進行教材排版，預計3月上旬完成。** | 110年6月30日 | 持續列管 |
| 119 | 109年12月30日 | 推動本市災害防救區域治理 | 消防局<br>樹林區<br>三峽區 | 規劃110年結合複訓課程辦理，預計上下半年各一次：<br>1. 上半年(4-5月)：預計於樹林區辦理教育訓練課程(汛期前災情查通報相關課程/十字路口防災遊戲)<br>2. 下半年(9-10月)：預計於三峽區辦理教育訓練課程(防救災技能訓練複訓) | 110年12月31日 | 持續列管 |

# 四、災防辦宣達事項

# 災防辦宣達事項說明

01 區級(自主型)社區啟動及推動時間統計

02 升級韌性社區推動說明

03 110年度區公所實地輔導規劃

04 110年防災士培訓規劃

05 公所透過多元管道向民眾推廣防災工作

06 110年防災公園整備點檢及開設抽測辦理方式

# 區級(自主型)社區啟動及推動時間統計

★ 請尚未確認各堂課程日期之區公所提前規劃，並提報輔導團，以利講師安排。(填寫網址：https://reurl.cc/726eGd)

★ 9月底前需協助社區提報認證申請資料，建議各區公所於8月底前完成課程推動。

★ 110年各區推動自主型防災社區共28處，各社區啟動及推動時間如下：

| 序號 | 行政區 | 社區名單 | 啟動時間 | 災害環境診斷及救災對策研擬 | 防救災組織建立與防災計畫研擬 | 防救災技能訓練 | 社區防救災演練暨工作成果發表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋區 | 僑中里 | 3月 | 4月 | 5月 | 5月 | 6月 |
| 2 | 三重區 | 五華里 | 3月 | 4月 | 4月 | 4月 | 6月 |
| 3 | 中和區 | 中安里 | 3月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 4 | 永和區 | 福和里 | 3月 | 4月9日上午9時 | 5月7日上午9時 | 6月4日上午9時 | 8月 |
| 5 | 新莊區 | 萬安里 | 4月 | 4月10日下午2時 | 5月15日下午2時 | 5月29日下午2時 | 6月26日下午3時 |
| 6 | 新店區 | 中山里 | 3月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7 | 土城區 | 青山里 | 5月 | 6月 | 6月 | 6月 | 7月 |
| 8 | 蘆洲區 | 永康里 | 4月 | 5月8日<br>下午1時30分 | 5月29日<br>下午1時30分 | 6月19日<br>下午1時30分 | 7月10日<br>下午1時30分 |
| 9 | 樹林區 | 樹興里 | 3月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 10 | 汐止區 | 自強里 | 5月 | 5月 | 6月 | 6月 | 7月 |

# 區級(自主型)社區啟動及推動時間統計

| 序號 | 行政區 | 社區名單 | 啟動時間 | 災害環境診斷及救災對策研擬 | 防救災組織建立與防災計畫研擬 | 防救災技能訓練 | 社區防救災演練暨工作成果發表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 鶯歌區 | 中湖里 | 6月 | 6月 | 7月 | 7月 | 8月 |
| 12 | 三峽區 | 添福里 | 6月 | 6月 | 7月 | 7月 | 8月 |
| 13 | 淡水區 | 文化里 | 3月 | 3月11日上午9時 | 3月18日上午10時 | 4月9日上午10時 | 5月7日上午8時 |
| 14 | 瑞芳區 | 吉安里 | 6月 | 6月 | 7月 | 7月 | 8月 |
| 15 | 五股區 | 成德里 | 5月 | 6月 | 7月 | 7月 | 8月 |
| 16 | 泰山區 | 新明里 | 6月 | 6月 | 7月 | 8月 | 8月 |
| 17 | 林口區 | 東勢里 | 3月 | 4月17日上午9時 | 5月15日上午10時 | 6月5日上午10時 | 7月3日上午8時 |
| 18 | 深坑區 | 萬福里 | 4月 | 4月 | 5月 | 5月 | 6月 |
| 19 | 石碇區 | 永安里 | 3月 | 3月18日上午9時 | 3月18日下午1時 | 3月27日 | 8月 |
| 20 | 坪林區 | 石(石曹)里 | 6月 | 6月中 | 7月初 | 7月底 | 8月中 |
| 21 | 三芝區 | 新庄里 | 6月 | 6月 | 7月 | 7月 | 8月 |
| 22 | 石門區 | 石門里 | 6月 | 6月 | 7月 | 7月 | 8月 |
| 23 | 八里區 | 大崁里 | 6月 | 7月6日上午9時 | 7月20日上午9時 | 8月3日上午9時 | 8月17日上午8時 |
| 24 | 平溪區 | 石底里 | 6月 | 6月 | 7月 | 7月 | 8月 |
| 25 | 雙溪區 | 上林里 | 3月 | 3月17日上午9時 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 26 | 貢寮區 | 真理里 | 6月 | 6月 | 7月 | 7月 | 8月 |
| 27 | 金山區 | 磺港里 | 6月 | 6月 | 7月 | 8月 | 8月 |
| 28 | 萬里區 | 龜吼里 | 2月 | 3月12日上午8時30分 | 3月26日上午10時 | 4月9日上午10時 | 5月7日上午10時 |

# 升級韌性社區推動說明

★ 為辦理內政部消防署韌性社區作業，第1梯次規劃9區公所辦理升級韌性社區作業。

★ 將規劃於9月(3區)、10月(3區)、11月(3區)提報韌性社區認證申請。

| 第一梯次(110年) | 第二梯次(111年) | 第三梯次(112年) |
|---|---|---|
| 新店區觀天下社區 | 板橋區 | 中和區 |
| 林口區下福里 | 三重區 | 永和區 |
| 平溪區嶺腳里 | 蘆洲區 | 汐止區 |
| 雙溪區牡丹里 | 三峽區 | 淡水區 |
| 坪林區大林里 | 土城區 | 新莊區 |
| 烏來區忠治里 | 樹林區 | 萬里區 |
| 貢寮區仁里里 | 五股區 | 金山區 |
| 石碇區永定里 | 鶯歌區 | 八里區 |
| 泰山區大科里 | 石門區 | 深坑區 |
| | 三芝區 | 瑞芳區 |

# 110年度區公所實地輔導規劃

★ 辦理時間：預定3-4月辦理。
★ 實地輔導於各區災防會報程序中辦理，期程規劃如下：

| 項次 | 輔導日期 | 時間 | 區公所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3月8日(星期一) | 下午 | 蘆洲區 |
| 2 | 3月9日(星期二) | 上午 | 淡水區 |
| | | 下午 | 林口區 |
| 3 | 3月10日(星期三) | 下午 | 三重區 |
| 4 | 3月12日(星期五) | 上午 | 汐止區 |
| | | 下午 | 板橋區 |
| 5 | 3月15日(星期一) | 下午 | 永和區 |
| 6 | 3月16日(星期二) | 上午 | 三峽區 |
| | | 下午 | 土城區 |
| 7 | 3月17日(星期三) | 下午 | 樹林區 |
| 8 | 3月19日(星期五) | 上午 | 新莊區 |
| | | 下午 | 新店區 |
| 9 | 3月22日(星期一) | 下午 | 中和區 |
| 10 | 3月23日(星期二) | 上午 | 坪林區 |
| | | 下午 | 八里區 |
| 11 | 3月24日(星期三) | 下午 | 雙溪區 |
| 12 | 3月26日(星期五) | 上午 | 五股區 |
| | | 下午 | 瑞芳區 |
| 13 | 3月29日(星期一) | 下午 | 石碇區 |
| 14 | 3月30日(星期二) | 上午 | 貢寮區 |
| | | 下午 | 鶯歌區 |
| 15 | 3月31日(星期三) | 下午 | 石門區 |
| 16 | 4月6日(星期二) | 上午 | 泰山區 |
| | | 下午 | 三芝區 |
| 17 | 4月7日(星期三) | 下午 | 萬里區 |
| 18 | 4月9日(星期五) | 上午 | 平溪區 |
| | | 下午 | 金山區 |
| 19 | 4月12日(星期二) | 下午 | 烏來區 |
| 20 | 4月13日(星期三) | 上午 | 深坑區 |

# 110年度防災士培訓規劃

★ 110年將辦理4梯次防災士培訓，每梯次預計培訓100名防災士。

★ 分為A、B兩班授課，一班50名為上限。

| 期別 | 預計辦理時間 | 辦理地點 |
|---|---|---|
| 第8期 | 6月15日、6月16日 | 慈濟雙和靜思堂 |
| 第9期 | 8月17日、8月18日 | 慈濟雙和靜思堂 |
| 第10期 | 9月28日、9月29日 | 慈濟三重靜思堂 |
| 第11期 | 10月19日、10月20日 | 汐止保長坑訓練中心 |

# 公所透過多元管道向民眾推廣防災工作

★ 110年內政部深耕計畫績效評估指標項目如下

① **基本指標**：區公所須針對民眾藉由多元管道推廣防災工作，並統計場次及對象(包括轄區各項活動、新聞媒體報導、防災專區、跑馬燈等)。

② **進階指標**：有針對轄區內的災害弱勢進行防災宣導；有針對長期照顧機構納入防災宣導；運用防災士參與或協助防災相關工作；宣導方式有結合在地企業或民間團體。

★ 請各區公所依據上述指標提前規劃宣導及推廣，並請各區統計1-3月推廣防災工作之成果，並於3月18日前將成果函報市府。

★ 各區公所推廣資料經彙整後，將納入本市函報內政部之第1季季報表成果，請各區公所依限函報，該項目為本市深耕計畫管考計畫平時考核項目。

110 年區公所向民眾推廣防災工作總表

| 類別 / 公所 | 公所網站、社群 (LINE、FB) | 電子看板、LED跑馬燈系統 | 公佈欄 | 廣播系統 | 宣導活動、教育訓練 | 企業防災、防災社區、災防演練等活動 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋區 | (請填數量) | (請填數量) | (請填數量) | (請填數量) | (請填數量) | (請填數量) | (請填數量) |
| 三重區 | | | | | | | |
| 中和區 | | | | | | | |

新北市○○區公所 110 年向民眾推廣防災工作成果

時間：109 年 7 月 1 日(範例)
地點：建興公共托老中心
類別：宣導活動
人數：50 人
活動名稱及內容：新住民生活節能減碳文化多元融合活動，向民眾宣導防災觀念
新聞媒體報導網址：無

格式範例

# 110年防災公園整備點檢及開設抽測辦理方式

★ 辦理4梯次之防災公園無預警抽測收容演練，為培養鄰近區公所相互支援默契，故擬延續109年計畫辦理區公所跨區支援機制，以強化區公所因應大規模震災之防災公園緊急開設、調度、指揮能力。

★ 區公所應於受測當月2日前將「防災物資設備自主檢核表」、「整備驗證作業提報表」等成果資料函報予本府災防辦備查。

| 序號 | 抽測梯次 | 動員抽測月份 | 受測公所名單 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第1梯次 | 3月<br>(訂於3/8-9間) | 板橋區<br>三峽區<br>泰山區<br>新店區<br>土城區 |
| 2 | 第2梯次 | 6月<br>(訂於6/8-9間) | 永和區<br>蘆洲區<br>新莊區<br>樹林區<br>三重區 |
| 3 | 第3梯次 | 9月<br>(訂於9/8-9間) | 中和區<br>林口區<br>五股區<br>淡水區<br>八里區 |
| 4 | 第4梯次 | 12月<br>(訂於12/8-9間) | 深坑區<br>汐止區<br>瑞芳區<br>鶯歌區 |

| 序號 | 受測區公所 | 支援區公所 | 序號 | 受測區公所 | 支援區公所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋 | 中和 | 11 | 林口 | 泰山 |
| 2 | 中和 | 板橋 | 12 | 三重 | 蘆洲 |
| 3 | 永和 | 中和 | 13 | 蘆洲 | 三重 |
| 4 | 土城 | 樹林 | 14 | 新店 | 深坑 |
| 5 | 樹林 | 土城 | 15 | 深坑 | 新店 |
| 6 | 三峽 | 鶯歌 | 16 | 淡水 | 八里 |
| 7 | 鶯歌 | 三峽 | 17 | 八里 | 淡水 |
| 8 | 新莊 | 五股 | 18 | 汐止 | 瑞芳 |
| 9 | 五股 | 新莊 | 19 | 瑞芳 | 汐止 |
| 10 | 泰山 | 林口 | | | |

*負責支援之區公所重點事項:

① 支援人力不得少於10人

② 支援物資項目:應支援家庭帳篷、男性單身帳篷、女性單身帳篷、淋浴帳、功能場站之宮庭帳篷等，前揭物資項目數量經與受測區公所協調所需數量後，並依現場指揮官指揮於防災公園指定位置完成架設

# 五、2月工作進度報告
# 3月預定進度報告

# 2月份工作進度

# 籌備區長班災害防救教育講習

★ 將於3月3日區政會議後辦理區長班講習

| 時間 | 課程內容 | 主講人 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10：30-10：40<br>（10分鐘） | 重點提示 | 劉副市長和然 | 本府18樓<br>市政會議室 |
| 10：40-11：05<br>（15分鐘） | 110年區級災害<br>防救執行重點及策進作為 | 消防局<br>李清安副局長 | |
| 11：05-11：20<br>（25分鐘） | 災害應變中心<br>開設系統及工具 | 消防局<br>李清安副局長 | |
| 11：20-11：30<br>（10分鐘） | 總結 | 劉副市長和然 | |

# 韌性社區啟動與拜訪里長

★ 消防局推動之韌性社區已於1月啟動，分別至各社區**拜訪里長**，說明韌性社區推動工作事宜，並規劃工作團隊組成與指導會議。

★ **2月23日**辦理新莊區合鳳里工作團隊組成與指導會議。

| 社區 | 拜訪時間 |
|---|---|
| 新莊區合鳳里 | 1月25日 |
| 中和區碧河里 | 1月29日 |
| 八里區茄苳里 | 2月22日 |
| 萬里區北基里 | 2月22日 |

中和區碧河里

萬里區北基里

新莊區合鳳里團隊組成

新莊區合鳳里

八里區茄苳里

# 三峽區有木里標竿社區導覽路線規劃

★ 導覽路線踏勘。(有木里辦公室)

★ 研擬指標社區導覽動線，針對導覽行程進行安排，暫定時序：

① 時間安排：參訪單位於09:30~10:00抵達有木里、11:00抵達大板根聽簡報。

② 導覽歷史災害地點，預計順序如下：

A. 訪客遊覽車先到滿月圓大型車停車場(下車休息/歡迎參訪)，第一站桂伯宅(蘇迪勒風災，屋毀人安）10分鐘

B. 有木190號災點(蘇迪勒風災)。(上遊覽車順下行駛)2分鐘

C. 明隧道附近不時的土石滑落。2分鐘

D. 千戶傳奇生態農場(蘇迪勒風災土石流沖毀，重建)。10分鐘

E. 北114線坍方道路6.5k處道路中斷(蘇迪勒風災)。2分鐘(往大板根途中導覽)

F. 結束災點導覽後，前往大板根進行防災(韌性)社區經驗分享。(影片及簡報&贈送禮物) 24分鐘+10分鐘Q&A+合照

G. 沿途報導其它商家景點(工商服務)。

# 三峽區有木里標竿社區導覽路線規劃

社區導覽路長8.5公里
主要災區地點ABCDE五處
及避難所到防災企業
車程約17-20分鐘
途中簡報26分鐘
10:00抵達停車場
11:00前會到大板根

# 105-108年歷史災害潛勢地區案件處置情形說明

★ 109年已彙整29區提報資料，提報災點資料共計522件，經檢視已改善517件、改善中5件(主辦單位：市府局處5件)。

★ 110年2月3日已函文各區調查109年災害潛勢調查表，請各區公所於3月3日前函復。

| 行政區 | 水災災害事件 | 坡地災害事件 | 地震災害事件 | 其他災害事件 | 總案件數 | 總計522件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 已改善案件 | 改善中案件 |
| 板橋區 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 三重區 | 11 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 中和區 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 永和區 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 新莊區 | 9 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 新店區 | 15 | 18 | 0 | 1 | 34 | 34 | 0 |
| 土城區 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 蘆洲區 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 樹林區 | 9 | 6 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 |
| 汐止區 | 2 | 13 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| 鶯歌區 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 (111年完工，由水利局自行列管) |
| 三峽區 | 4 | 21 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 |
| 淡水區 | 10 | 4 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 |
| 瑞芳區 | 9 | 19 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 (尚未准予動工，後續由水利局自行列管) |
| 五股區 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 泰山區 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 林口區 | 4 | 13 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 |
| 深坑區 | 1 | 9 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 石碇區 | 1 | 9 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 坪林區 | 0 | 16 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 |
| 三芝區 | 2 | 25 | 0 | 4 | 31 | 31 | 0 |
| 石門區 | 9 | 58 | 0 | 2 | 69 | 69 | 0 |
| 八里區 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 平溪區 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 雙溪區 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 貢寮區 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 金山區 | 7 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 萬里區 | 5 | 23 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 |
| 烏來區 | 1 | 11 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| 總計 | 182 | 296 | 1 | 43 | 522 | 517 | 5 |

# 105-108年歷史災害潛勢地區案件處置情形說明

| 編號 | 行政區 | 發生時間 | 事件地點 | 災害情形描述/易致災說明 | 主辦單位/權責單位 | 主辦單位回覆施工日期、說明及處置作為/其他單位意見 | 管考意見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108淹水09 | 永和區 | 108年7月22日(1080722豪大雨事件) | 林森路、永利路、永貞路交叉路口 | 1. 排水不良、地勢低窪且雨勢過大時累積雨量達 73.5 mm。<br>2. 108 年度以前曾發生 3 次，1070908豪大雨事件、1060802豪大雨事件及1060602豪大雨事件 | 水利局 | 主辦單位:<br>□已改善 □未改善 ■改善中<br>水利局：**「新北市永和區FG雨水下水道幹線第二期新建工程」**，本案規劃增設滯洪抽水設施W1.9*H1.75* L20(m)、2*6’’ 鋼管，工程經費4,163萬，**預計110年2月28日完工**。 | **請持續更新改善進度** |
| 107淹水05 | 永和區 | 107 年 9 月8日 | 林森路單號側 | 1. 地勢低窪，雨勢過大，日累積雨量達 101.5mm ，最大時雨量:73.5mm/hr。<br>2. 雨勢大且急，積淹水面積甚大，惟雨勢變小後一小時內積淹水消退。<br>3. 107年度以前曾發生2次，民國106年6月及民國106年8月。 | 水利局 | 主辦單位:<br>□已改善 □未改善 ■改善中<br>水利局：**「新北市永和區FG雨水下水道幹線第二期新建工程」**，本案規劃增設滯洪抽水設施W1.9*H1.75* L20(m)、2*6’’ 鋼管，工程經費4,163萬，**預計110年2月28日完工**。 | **請持續更新改善進度** |
| 106淹水09 | 永和區 | 106年8月2日 | 林森路單號側、永利路與永貞路口 | 1. 地勢低窪，雨勢過大，時雨量最高達101mm(中正橋測站)，10分鐘雨量達21.5mm<br>2. 雨勢大且急，積淹水面積甚大，惟雨勢變小後一小時內積淹水消退。<br>3. 106年度以前曾發生1次。 | 水利局 | 主辦單位:<br>□已改善 □未改善 ■改善中<br>• 水利局：1.林森路單號側、永利路與永貞路口：後續仍請公所加強雨水下水道清淤。此案改善中。2. **「新北市永和區FG雨水下水道幹線第二期新建工程」**，於108年5月開工，本案規劃增設滯洪抽水設施W1.9*H1.75* L20(m)、2*6’’ 鋼管，工程經費4,163萬，**預計110年2月28日完工**。<br>• 永和區公所：新北永役字第1072031551號 | **請持續更新改善進度** |

# 防災避難看板選址與現勘-樣式及注意事項

**防災避難看板設置地點調查及現勘**

**繪製防災避難看版圖面**

■ 請各區公所填報**新增或須修繕**之防災避難看板資訊。

# 防災避難看板選址與現勘-樣式及注意事項

## 1.引導至避難收容處所

- 依據內政部106年3月3日修正之「防災地圖作業手冊修正規定」，每處避難收容處所至少規劃設置1個避難收容處所方向指示牌及1個避難收容處所告示牌。

防災避難看板

避難收容處所
方向指示牌

避難收容處所
告示牌

資料來源：內政部「防災地圖作業手冊修正規定」

# 防災避難看板選址與現勘-樣式及注意事項

## 2.引導至防災公園

- 若轄區有建置防災公園，亦可製作引導至防災公園之避難看板。

現在位置

中間方向指示牌

收容處所

# 防災避難看板選址與現勘-樣式及注意事項

## 3.融入街道景觀

- 配合鶯歌區老街整體意象，將避難收容處所方向指示牌融入既有之街道景觀特色。

## 4.配合觀光旅遊景點及當地特色

- 104年度設計之特色看板(平溪-天燈；蘆洲-神將)也予以沿用至105年度需裝設之收容所看板上。
- 105、109年度則挑選將轄區之特色意象與看板融合(深坑-臭豆腐；中和-土地公、老櫻花樹；鶯歌-區徽；坪林-藍鵲鳥；八里-渡船頭、老榕碉堡)。

# 防災避難看板選址與現勘-樣式及注意事項

## 5.引導至避難收容處所

- 106年度協助金山、瑞芳區增設越南語於防災避難看板。
- 因近年來金山及瑞芳區轄內外籍人口眾多尤以越南人為最，為使當地防災避難看板達到使用人之最高效益，故將其語言與新製防災避難看板融合。

現在位置

中間方向指示牌

收容處所

# 防災避難看板選址與現勘

## 填寫前

附件 1

_____區 110 年防災避難看板設置調查表

日期：110 年___月___日

| 現在位置(120×80cm) | | | |
|---|---|---|---|
| 地址 | | | |
| 座標 | | | |
| 指北針 | | | |
| | 備註：請面對欲裝設避難看板之位置，進行指北針方向的查詢 | | |
| 箭頭(請圈選) | ← | ↑ | → |
| | 備註：為現在位置至收容場所之方向 | | |
| 支架(請圈選) | 是 | 否 | |
| 設置地點照片 | | | |
| 手機 指北針 截圖 | 手機 google map 截圖 | | |

| 中間方向指示牌(60×25cm) | | |
|---|---|---|
| 地址 | | |
| 座標 或<br>燈桿/電線桿編號 | | |
| | 備註：以填寫座標為主，若附近有路燈或是電線杆編號可輔助填寫 | |
| 箭頭(請圈選) | ← | ↑ | → |
| | 特殊方向 | 若有特殊方向需求，填表者可於該欄位自行繪製示意。 |
| | 備註：為中間方向指示牌至收容場所之方向 | |
| 支架(請圈選) | 是 | 否 |
| 設置地點照片 | | |

| 收容所告示牌(60×45cm) | | |
|---|---|---|
| 無論該組導向之收容處所看板是否已建置，**皆須填寫收容所告示牌欄位**，以供後續計算步行距離使用。 | | |
| 收容場所名稱 | | |
| 收容場所英文名稱 | | |
| 特色看板製作意願<br>(有意願才需填寫) | 當地特色 | 範例：平溪區天燈、鹿洲區神將、中和區烘爐地土地公及老櫻花樹 |
| | 為何選擇該處製作特色看板 | 範例：平溪區天燈<br>理由：該看板設置於平溪老街周邊，觀光人潮眾多，故有設置避難看板之需求，且施放天燈已成為平溪區遠近馳名的儀式活動；結合避難看板與當地特色，並設置於人潮眾多之處，除可於災時提供避難指引，亦能於平時附含教育意義。 |
| 地址 | | |
| 座標 | | |
| 是否已建置(請圈選) | 是 | 否 |
| 支架(請圈選) | 是 | 否 |
| 設置地點照片 | | |

**若公所有設置特色看板之意願，請詳細填寫當地特色及選址等理由。**

備註：

1. 避難看板可建於區內群眾聚集之**觀光景點、老街、夜市**或**沿岸海嘯潛勢範圍**內等位置，終點除指向**避難收處所**外，亦可選擇指向區內**防災公園**。
2. 建議提報位置可臨近防災社區。

# 防災避難看板選址

## 填寫後範例

1. 座標：填寫google座標，以便於提供給廠商設置點位。
2. 指北針：便於繪製看板地圖時使用。
3. 箭頭：指向避難收容場所之方向，並於看板上註明步行距離。
4. 支架：若可直接裝釘於牆面則不需要支架。

平溪區109年防災避難看板設置調查表（範例）

日期：109年2月26日

| 現在位置(120×80cm) | | |
|---|---|---|
| 地址 | 新北市平溪區平湖里坑頭4號(里辦佈告欄)附近 | |
| 座標 | 25.0262377,121.7830912 | |
| 指北針 | 245° | |
| | 備註：請面對欲裝設避難看板之位置，進行指北針方向的查詢 | |
| 箭頭(請圈選) | ← | ↑ |
| | → | |
| | 備註：為現在位置至收容場所之方向 | |
| 支架(請圈選) | 是 | 否 |

於照片上後製看板位置，利於辨識設置位置




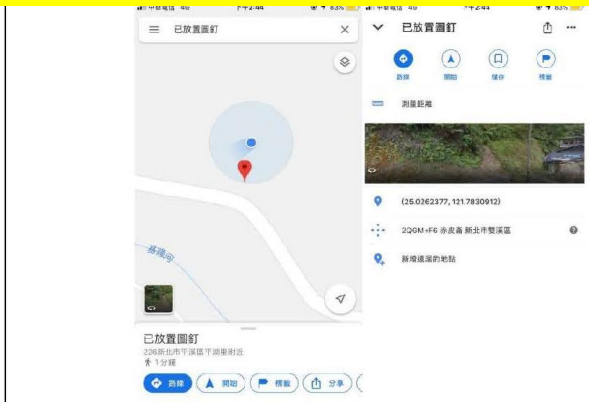

# 防災避難看板選址

## 填寫後範例

1. 座標：填寫google座標，以便於提供給廠商設置點位。
2. 電線杆/路燈編號：便於確定裝設位置。
3. 箭頭：指向避難收容場所之方向，並於看板上註明步行距離。
4. 支架：若可直接裝釘於牆面/電線杆/路燈則不需要支架。

**若有特殊方向需求，填表者可於該欄位自行繪製示意。**

**中間方向指示牌(60×25cm)**

| | |
|---|---|
| 地址 | 新北市平溪區平湖里大湖 10 號前方柵欄 |
| 座標 或 燈桿/電線桿編號 | 25.0261195,121.781043?(電桿編號:611048) |
| | 備註：以填寫座標為主，若附近有路燈或是電線杆編號可輔助填寫 |
| 箭頭(請圈選) | ← ↑ → |
| | 特殊方向 |
| | 備註：為中間方向指示牌至收容場所之方向 |
| 支架(請圈選) | 是 否 |

**於照片上後製看板位置，利於辨識設置位置**

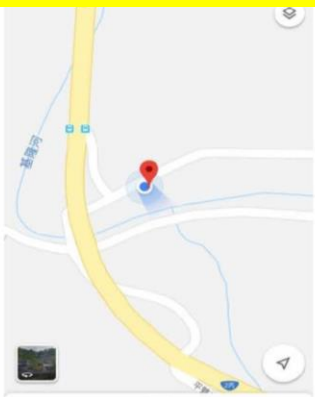

# 防災避難看板選址

## 填寫後範例

1. 無論該組導向之收容處所看板是否已建置，**皆須填寫收容所告示牌欄位**，以供後續計算步行距離使用。
2. 收容場所英文名稱：**請填寫正確收容場所之英文**，避免因使用「羅馬拼音查詢系統」之翻譯有所出入。
3. 座標：填寫google座標，以便於提供給廠商設置點位。
4. 支架：若可直接裝釘於牆面則不需要支架。

| 收容所告示牌(60×45cm) | | |
|---|---|---|
| 收容場所名稱 | 平湖市民活動中心 | |
| 收容場所英文名稱 | Pinghu Civic Center | |
| 地址 | 新北市平溪區平湖里大湖 10 號 | |
| 座標 | 25.0258087,121.7813035 | |
| 是否已建置(請圈選) | 是 | 否 |
| 支架(請圈選) | 是 | 否 |

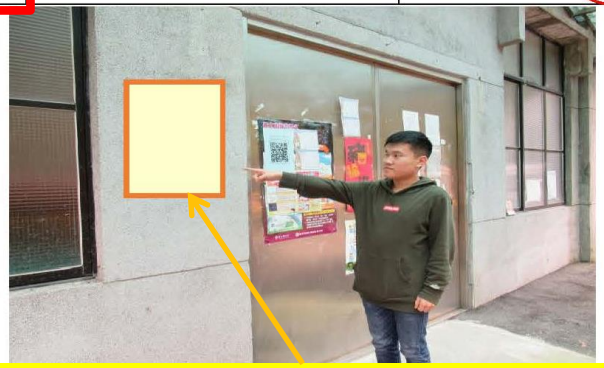

**於照片上後製看板位置，利於辨識設置位置**

備註：

1. 避難看板可建於區內群眾聚集之觀光景點、老街、夜市或沿岸海嘯潛勢範圍內等位置，終點除指向避難收處所外，亦可選擇指向區內防災公園。
2. 建議提報位置可臨近防災社區。

# 3月預定工作報告

- 辦理區長班災害防救教育講習(3/3)
- 辦理區公所實地輔導
- 持續辦理韌性社區工作團隊組成與指導會議
- 調查各區防災避難看板設置地點
- 規劃整合型防災社區推動說明會
- 設計三峽區有木里標竿社區LOGO圖示

# 六、國際災例分析

# 國際重大災害應變分析

## 110年1月印尼蘇拉威西島地震事件

# 事件描述

- 時間：2021年1月15日
- 地點：印尼蘇拉威西島
- 事件描述：15日當地時間清晨2時28分，發生6.2(Mw)淺層地震，衝擊西蘇拉威西省，包含馬武柔、馬杰內及波里哇利曼達爾縣等城鎮受影響，各地區傷亡及基礎設施災損情形嚴重，所幸並無發布海嘯警報。

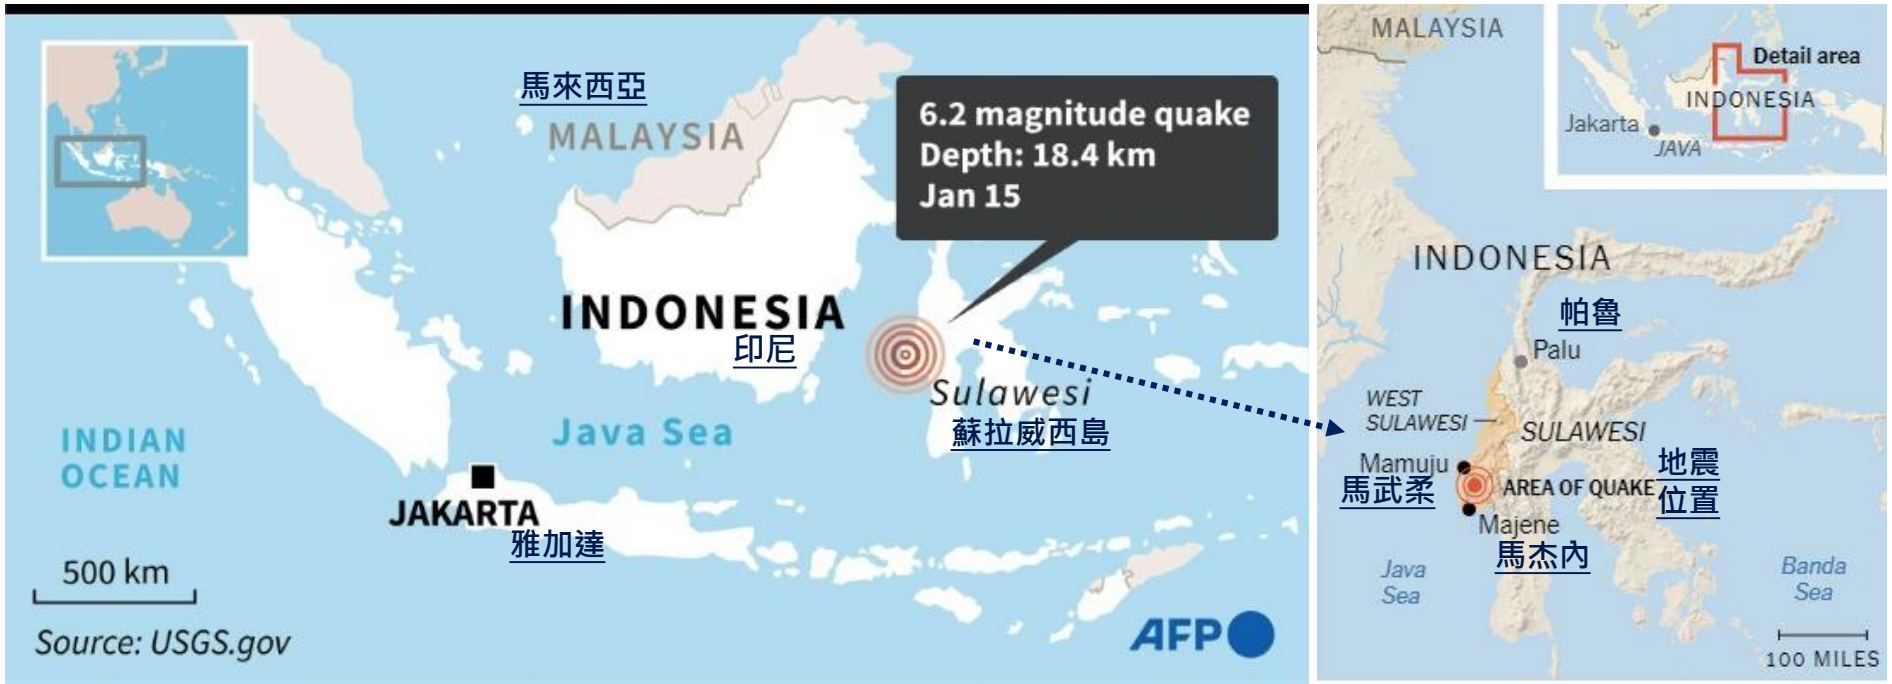


資料來源：
AFP：https://twitter.com/afp/status/1349979529830273026

# 災情描述 (1/2)

Emergency Response Coordination Centre (ERCC) – DG ECHO Daily Map | 25/01/2021

## Indonesia | 6.2M Earthquake of 14 January (update)

European Commission

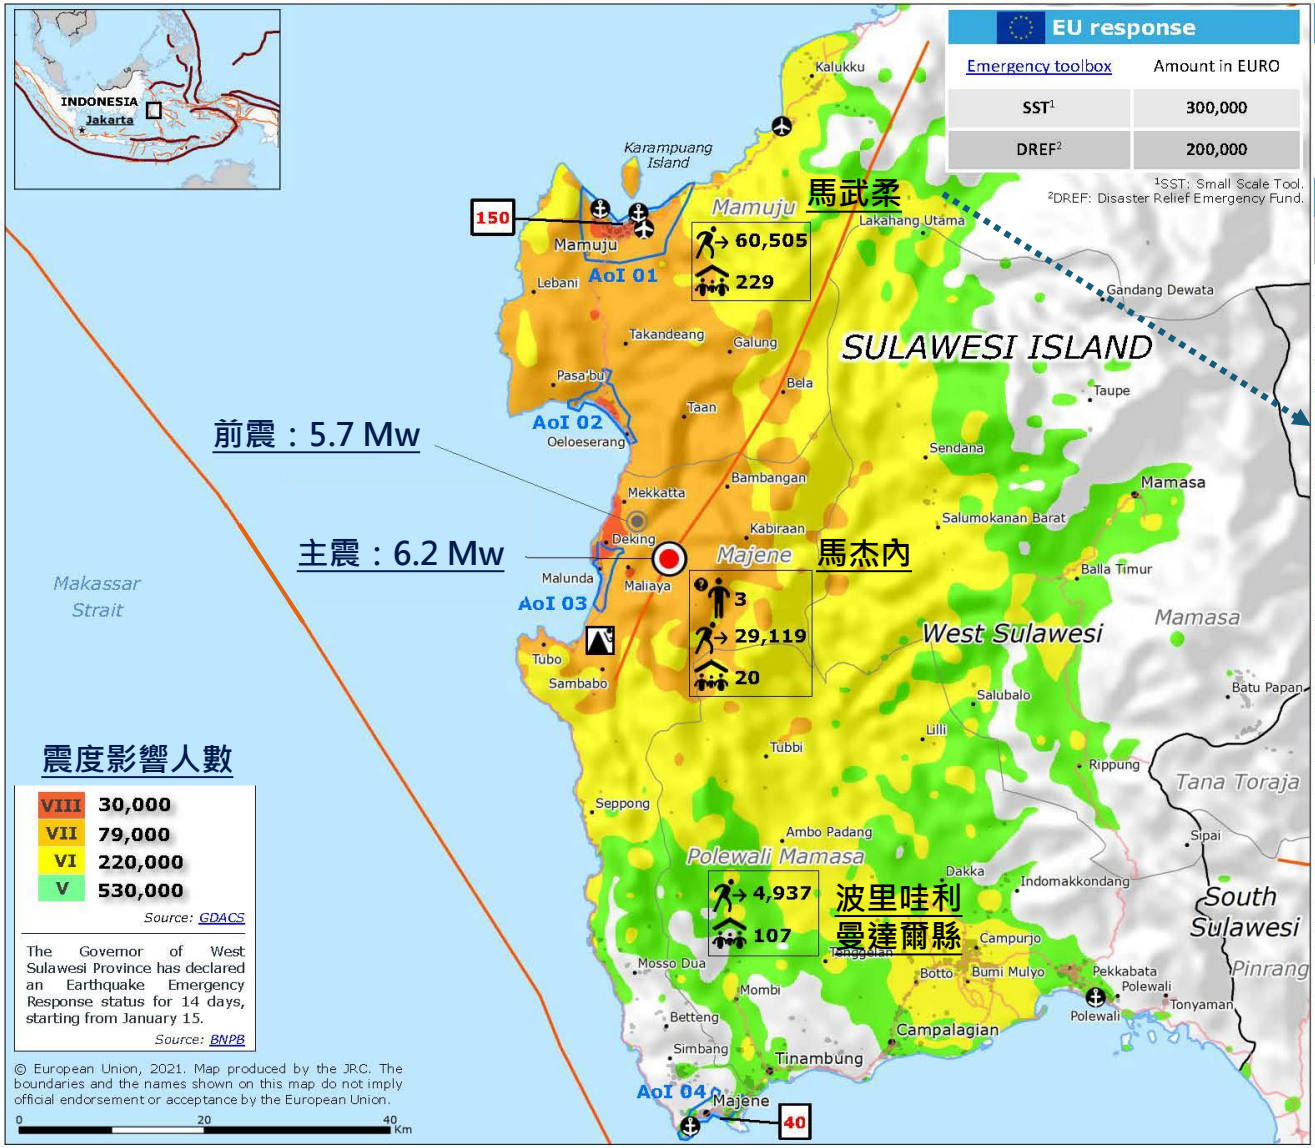


### EU response

| Emergency toolbox | Amount in EURO |
|---|---|
| SST[1] | 300,000 |
| DREF[2] | 200,000 |

[1]SST: Small Scale Tool.
[2]DREF: Disaster Relief Emergency Fund.

### Impact overview

as of 25 January (*Source: AHA Centre*)

- **107** Fatalities (Mamuju, Majene, Polewali Mamasa Regencies)
- **94,561** Displaced people
- **3** Missing people
- **356** Evacuation centres
- **3,369** Injured people
- **1,216** Damaged buildings

### Built-up damage within AoIs

As of 25 January (*Source: Copernicus EMS*)

| AoI | Destroyed | Damaged | Possibly damaged |
|---|---|---|---|
| 01 | 24 | 18 | 23 |
| 02 | na | na | 6 |
| 03 | na | na | na |
| 04 | na | na | 28 |

### 震度影響人數

| | |
|---|---|
| VIII | 30,000 |
| VII | 79,000 |
| VI | 220,000 |
| V | 530,000 |

*Source: GDACS*

The Governor of West Sulawesi Province has declared an Earthquake Emergency Response status for 14 days, starting from January 15.

*Source: BNPB*

22日受損建物及疏散中心分布圖

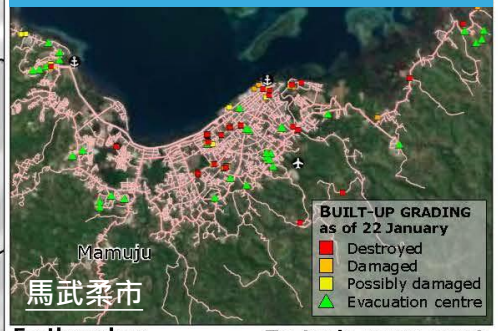


**Earthquakes**
*Source: GDACS, USGS*
- Main event
- 5.7M event
- Focal mechanism

**Modified Mercalli Scale intensity**
*Source: USGS*
- VIII Severe shaking
- VII Very strong shaking
- VI Strong shaking
- V Moderate shaking
- GDACS orange alert
- 40 Peak Ground Acceleration measurement (*Gal*)

*Source: BMKG*

**Tectonic assessment**
*Source: BMKG, BMKG*
- Subduction zone boundary
- Fault
- Triggered landslide *Source: BNPB*

**Copernicus EMS**
EMSR 493
Activation date 15 Jan
- Area of interest (AoI)
- Airport
- Port
- Main road
- Settlements *Source: JRC GHSL*
- Province
- Regency

© European Union, 2021. Map produced by the JRC. The boundaries and the names shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the European Union.

0 20 40 Km

資料來源：
ECHO：https://reliefweb.int/map/indonesia/indonesia-62m-earthquake-14-january-update-dg-echo-daily-map-25012021

# 災情描述 (2/2)

根據印尼國家抗災署(BNPB)，**共計105人不幸罹難**，3人失蹤，約3,369人輕重傷，**受影響約94,500人**，分配至356處避難中心，各地區電力、通訊、水力、交通等**重要維生設施中斷**，影響各地救援行動。

◆ 印尼蘇拉威西島災損情形初步估計

| 災損情形初步估計(1月18日) | | |
|---|---|---|
| 項目 | 災損類型 | 內容 |
| 1 | 政府單位 | ● 政府辦公處2間 |
| 2 | 醫療設施 | ● 醫院3間<br>● 醫療中心22處<br>● 社區衛生中心2處 |
| 3 | 教育機構 | ● 一般學校59間<br>● 伊斯蘭學校40間 |
| 4 | 公共建設 | ● 港口1處<br>● 橋梁1座 |
| 5 | 宗教場所 | ● 清真寺8座 |
| 6 | 觀光業者 | ● 旅館2間 |
| 7 | 民生建設 | ● 房屋倒塌7,850棟 |

馬武柔一搜救隊正尋找生還者

馬武柔各地救援情形

資料來源：
IFRC：https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-west-sulawesi-earthquake-emergency-plan-action-epoa-dref-operation-n

# 政府應變作為(1/2)

**印尼國家抗災署(BNPB)要求西蘇拉威西地震遭破壞建物進行初步評估，並提供資金援助進行復原重建，經BNPB快速評估結果，已針對西蘇拉威西省宣布進入14日緊急狀態。**

## ◆ 印尼當局受損房屋補助情形

| 受損房屋補助情形 | | |
|---|---|---|
| 項目 | 受損程度 | 補助金額 |
| 1 | 嚴重受損房屋 | 5,000萬盧比<br>(約68萬美金) |
| 2 | 中度受損房屋 | 2,500萬盧比<br>(約34萬美金) |
| 3 | 輕度受損房屋 | 1,000萬盧比<br>(約13萬美金) |

17日馬武柔一搜救犬正尋找生還者

## ◆ 印尼紅十字會針對災後運作風險評估作業

| 評估內容 | 因應方式 |
|---|---|
| 工作人員及志願工作者健康 | ● 工作人員及志願工作者基本教育訓練及訊息告知<br>● 在高風險影響地區必須正確使用PPE<br>● 印尼紅十字會工作人員及志工需針對COVID-19安全措施進行培訓<br>● 盡量減少非必要性旅行 |
| 避難中心COVID-19確診案例數增加 | ● 使用口罩或防毒面具，並保持一定距離或安全空間，勤洗手<br>● 分配口罩提供避難收容處所收容民眾使用<br>● 避難所/疏散中心強制控管安全距離 |
| 積極因應策略，處理相關負面新聞輿論報導 | ● 主動與新聞媒體及權益關係人溝通對談<br>● 鼓勵社區參與及責任制<br>● 全面需求分析、計畫、優先劃分、報告 |
| 人力配置及援助資金運作 | ● 蘇拉威西中部及南部已陸續支援工作人員及志工前往受影響地區，分支機構亦具有緊急執行應變能力。<br>● 印尼紅十字會短期人員需求工資已納入預算，IFRC將鼓勵印尼紅十字會招募有豐富經驗人員以支援各分支機構。 |

資料來源： CNN：https://edition.cnn.com/2021/01/14/asia/indonesia-sulawesi-earthquake-intl-hnk/index.html ；
IFRC：https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-west-sulawesi-earthquake-emergency-plan-action-epoa-dref-operation-n

# 政府應變作為(2/2)

印尼紅十字會(PMI)於**緊急計畫中納入性別平等考量**，優先援助以下家庭：無居住地家庭、孕婦或正處於哺乳期女性、單親女性家庭、**獨居長者及家庭中有行動不便者**。**IFRC已撥款救災應急基金約50萬美金**供PMI未來四個月人道協助。

◆ 印尼紅十字會針對震後可能引發災害發布相關作為

| 情境 | 導致結果 | 可能因應方式 |
|---|---|---|
| 發生餘震，導致海嘯或其他建築物倒塌 | 可能導致更多生命財產及基礎設施損失，收容人數上升 | 透過政府協助，印尼紅十字會可協助支援收集受影響地區監測資訊。印尼紅十字會將擴大其因應策略，並利用救災應急基金(DREF)，部署更多志工支援。 |
| 影響地區受到其他災害影響(如：水災) | 可能導致收容情況更無法負荷，加上衛生條件堪慮 | 印尼紅十字會將擴大其因應策略，與政府密切協商以優先考量無居住地者，並進一步提供資金及人力資源。 |
| 受影響地區列為禁建區 | 收容所需求需長時間才能解決，無居住地者需持續留在營地，可能導致長期生計及生心靈影響。 | 印尼紅十字會將透過長時間復原計畫支持受影響社區。 |

志工須先進行COVID-19檢測

18日馬武柔臨時收容所情形

資料來源： CNN：https://edition.cnn.com/2021/01/14/asia/indonesia-sulawesi-earthquake-intl-hnk/index.html；BNPB：https://www.bnpb.go.id/berita/desk-relawan-pastikan-relawan-gempa-sulbar-aman-covid19；中華民國紅十字會：https://www.redcross.org.tw/home.jsp?pageno=20120507002O&acttype=view&dataserno=202101210001

# 致災原因研判

由於印尼所處板塊構造，地震頻繁，根據美國地質調查局資料，**紀錄超過150次規模7以上強震**，最近一次重大地震傷亡事件為2018年9月28日，蘇拉威西島7.5(Mw)強震，造成4,340人不幸罹難，後續引發海嘯更造成600多人失蹤。

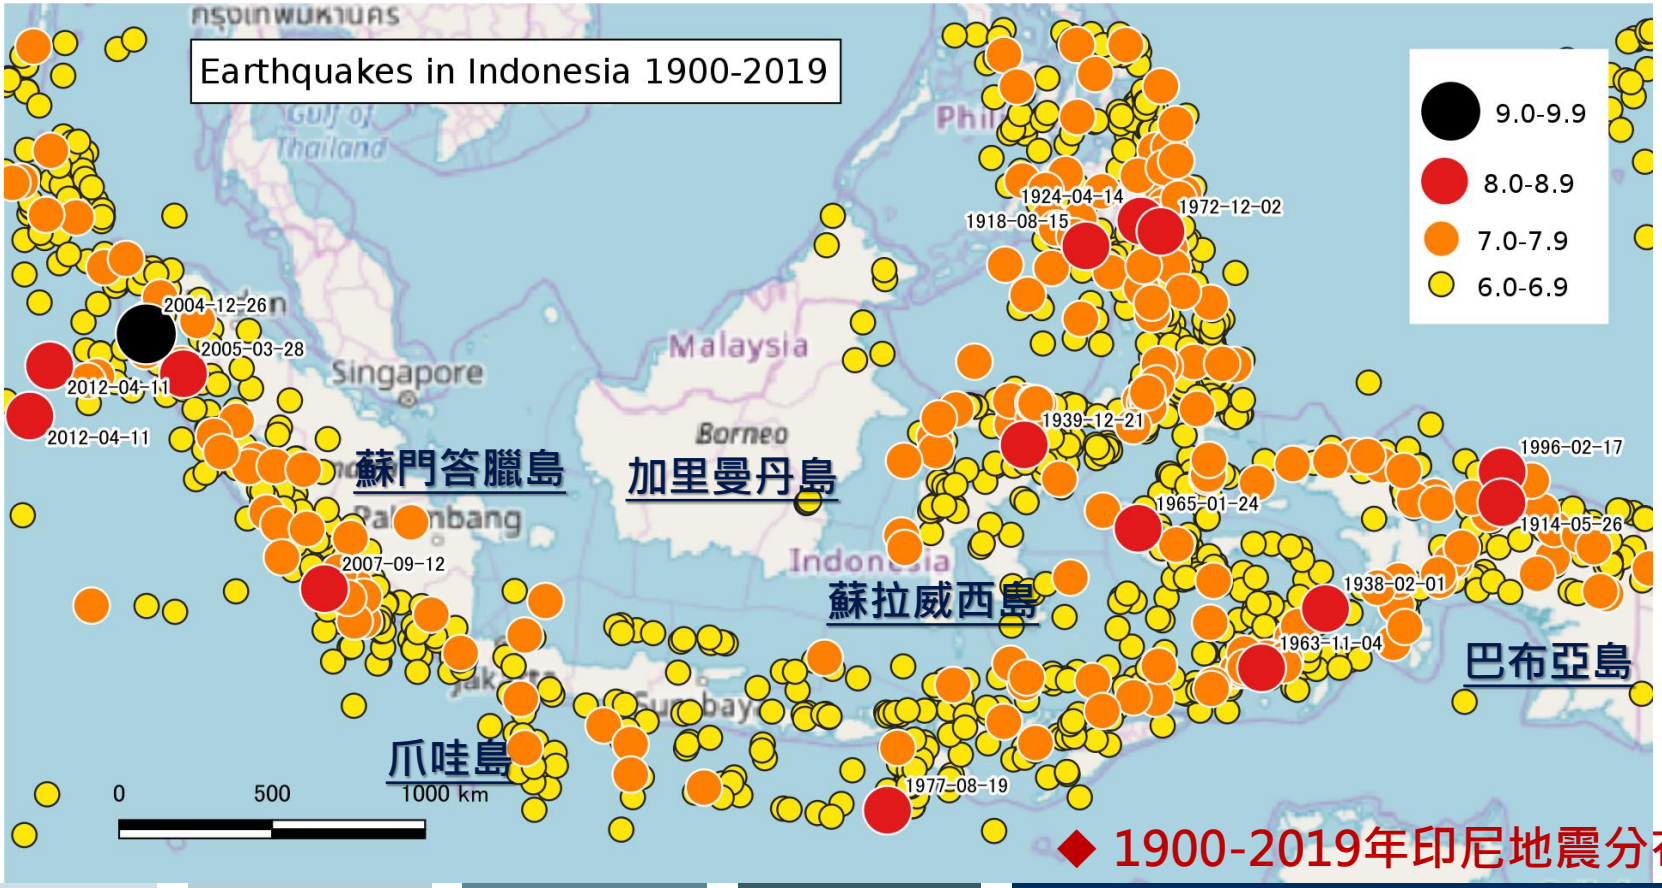


◆ 1900-2019年印尼地震分布圖

資料來源：
維基百科：https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_Indonesia

# 小結

## 政府單位、醫療機構等重要設施損毀

此次事件造成**西蘇拉威西省辦公處倒塌，各地通訊系統中斷**，當局無法將相關措施及資訊提供撤離民眾，另外，**重災區附近醫院嚴重損毀**，進而造成藥品庫存、手術包、麻醉及PPEs等供應有限，醫療人員**僅能透過臨時搭建流動診所，提供基本醫療服務**。於平時，基本維護備援災害應變中心場所及相關通訊設備更顯重要。

西蘇拉威西省辦公室受損情形

馬武柔一處收容所過度擁擠情形

馬武柔一處收容所過度擁擠情形

資料來源： CNN：https://edition.cnn.com/2021/01/14/asia/indonesia-sulawesi-earthquake-intl-hnk/index.html ；
The Guardian：https://www.theguardian.com/world/2021/jan/16/indonesia-earthquake-rescuers-hampered-by-damaged-infrastructure-after-dozens-killed

# 七、110年市、區級防災社區推動暨認證說明會

# 110年度
# 新北市推動區級災害防救及防災社區計畫

# 110年市、區級
# 防災社區推動暨認證說明會

主辦機關：新北市政府消防局
協力團隊：臺灣大學氣候天氣災害研究中心

# 簡報大綱(1/3)

## 壹、110年防災社區推動方式

一、防災社區推動歷程

二、防災社區遴選機制

三、防災社區推動步驟

四、110年度辦理方式說明

# 簡報大綱(2/3)

## 貳、新北市防災社區認證說明

一、前言

二、評選資料及評分標準

三、認證流程

四、推動及認證期程

五、防災社區標章及證書

六、持續作為

# 簡報大綱(3/3)

## 參、韌性社區推動說明

一、認識韌性社區

二、推動韌性社區工作項目

三、推動韌性社區活動

四、韌性社區防災計畫書架構

五、韌性社區認證申請

六、區公所及社區配合說明

# 壹、110年防災社區推動方式

# 一、防災社區推動歷程

## 新北市於98~109年共推動148處防災社區

備註：
- 藍字：已取得認證
- 紅字：已送內政部審查
- 紫色字：預計110年送審

| 序號 | 區 | 里 | 推動年度 | 推動單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋區（9） | 新興里 | 106 | 公所自辦 |
| | | 漳興里 | 106 | 公所自辦 |
| | | 滿翠里 | 107 | 公所自辦 |
| | | 宏翠里 | 107 | 公所自辦 |
| | | 振興里 | 108 | 公所自辦 |
| | | 振義里 | 108 | 社會局 |
| | | 景星里 | 109 | 公所自辦 |
| | | 廣德里 | 109 | 公所自辦 |
| | | 福德里 | 109 | 公所自辦 |
| 2 | 三重區（5） | 福民里 | 105 | 消防局 |
| | | 永盛里 | 107 | 自主型/消防局 |
| | | 大有里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 田中里 | 108、109 | 韌性社區/消防局 |
| | | 永安里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 3 | 中和區（6） | 德行里 | 101 | 消防局 |
| | | 內南里 | 106 | 消防局 |
| | | 頂南里 | 107 | 自主型/消防局 |
| | | 華新里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 嘉慶里 | 108、109 | 韌性社區/消防局 |
| | | 復興里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 4 | 永和區（3） | 竹林里 | 107 | 消防局 |
| | | 秀林里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 光明里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 5 | 新莊區（7） | 雙鳳生源社區(雙鳳里) | 99 | 消防局 |
| | | 立基里 | 100 | 消防局 |
| | | 民安里 | 107 | 自主型/消防局 |
| | | 民全里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 裕民里 | 108 | 水利局 |
| | | 光明里 | 109 | 水利局 |
| | | 建安里 | 109 | 自主型/消防局 |

| 序號 | 區 | 里 | 推動年度 | 推動單位 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 新店區（9） | 觀天下社區 | 98 | 消防局 |
| | | | 108 | 工務局 |
| | | 花園新城社區 | 99 | 消防局 |
| | | 屈尺里 | 105 | 消防局 |
| | | 廣興里(已取得認證) | 105 | 水利局 |
| | | | 108 | 區域治理/消防局 |
| | | | 109 | |
| | | 中興里 | 106 | 公所自辦 |
| | | 台北小城(小城里) | 107 | 工務局 |
| | | 塗潭里 | 107 | 公所自辦 |
| | | 日興里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 德安里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 7 | 土城區（5） | 廷寮里 | 104 | 消防局 |
| | | 祖田里 | 106 | 社會局 |
| | | 清化里 | 107 | 自主型/消防局 |
| | | 日新里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 頂埔里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 8 | 蘆洲區（5） | 水河里 | 106 | 消防局 |
| | | 水湳里 | 106 | 公所自辦 |
| | | 保新里 | 107 | 自主型/消防局 |
| | | 信義里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 仁愛里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 9 | 樹林區（4） | 東山里 | 106 | 農業局 |
| | | | 109 | 區域治理/消防局 |
| | | | 110 | |
| | | 中華里 | 107 | 自主型/消防局 |
| | | 金寮里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 坡內里 | 109 | 自主型/消防局 |

# 一、防災社區推動歷程

## 新北市於98~109年共推動148處防災社區

備註：
- 藍字：已取得認證
- 紅字：已送內政部審查
- 紫色字：預計110年送審

| 序號 | 區 | 里 | 推動年度 | 推動單位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 汐止區（9） | 迎旭山莊社區 | 100 | 消防局 |
| | | 白雲里 | 105 | 消防局 |
| | | 水蓮山莊 | 105 | 工務局 |
| | | 台北小別墅社區 | 106 | 工務局 |
| | | 忠山里 | 107 | 自主型/消防局 |
| | | 長青里 | 108 | 公所自辦 |
| | | 中興里 | 109 | 水利局 |
| | | 鄉長里 | 109 | 公所自辦 |
| | | 白雲山莊 | 109 | 工務局 |
| 11 | 鶯歌區（6） | 建國里 | 106 | 教育部 |
| | | 鳳鳴里 | 107 | 水利局 |
| | | 西鶯里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 建德里 | 108<br>109 | 韌性社區/消防局 |
| | | 北鶯里 | 109 | 農業局 |
| | | 大湖里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 12 | 三峽區（8） | 安坑里 | 104 | 消防局 |
| | | 五寮里 | 105 | 消防局 |
| | | 中埔里 | 105 | 水利局 |
| | | 嘉添里 | 106 | 農業局 |
| | | 礁溪里 | 107 | 水利局 |
| | | 鳶山里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 有木里 | 108<br>109 | 韌性社區/消防局 |
| | | 八張里 | 109 | 自主型/消防局 |

| 序號 | 區 | 里 | 推動年度 | 推動單位 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 淡水區（6） | 民生里 | 102 | 消防局 |
| | | | 108、109 | 韌性社區/消防局 |
| | | 油車里 | 107 | 自主型/消防局 |
| | | 新民里 | 108 | 區公所自辦 |
| | | 水源里 | 109 | 農業局 |
| | | 新興里 | 109 | 區公所自辦 |
| | | 鄧公里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 14 | 瑞芳區（5） | 猴硐地區 | 101 | 消防局 |
| | | 上天里 | 107 | 自主型/消防局 |
| | | 柑坪里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 瑞濱里 | 108 | 農業局 |
| | | 龍川里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 15 | 五股區（4） | 民義里 | 107 | 水利局 |
| | | 觀音里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 成泰里 | 109 | 水利局 |
| | | 興珍里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 16 | 泰山區（6） | 大科里 | 103 | 消防局 |
| | | 明志里 | 106 | 消防局 |
| | | 貴和里 | 107 | 自主型/消防局 |
| | | 福興里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 全興里 | 108 | 水利局 |
| | | 山腳里 | 109 | 自主型/消防局 |

# 一、防災社區推動歷程

## 新北市於98~109年共推動148處防災社區

備註：
- 藍字：已取得認證
- 紅字：已送內政部審查
- 紫色字：預計110年送審

| 序號 | 區 | 里 | 推動年度 | 推動單位 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 林口區（4） | 嘉寶里 | 106 | 消防局 |
| | | 西林里 | 107 | 自主型/消防局 |
| | | 下福里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 麗園里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 18 | 深坑區（4） | 土庫里 | 107 | 消防局 |
| | | 萬順里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 深坑里 | 108 | 水利局 |
| | | 埔新里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 19 | 石碇區（3） | 潭邊里 | 107 | 農業局 |
| | | 永定里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 中民里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 20 | 坪林區（4） | 坪林里 | 107 | 社會局 |
| | | 大林里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 粗窟里 | 108 | 農業局 |
| | | 漁光里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 21 | 三芝區（5） | 圓山里 | 104 | 消防局 |
| | | 古庄里 | 107 | 自主型/消防局 |
| | | 八賢里 | 108 | 公所自辦 |
| | | 錫板里 | 109 | 社會局 |
| | | 店子里 | 109 | 公所自辦 |
| 22 | 石門區（3） | 尖鹿里 | 107 | 消防局 |
| | | 老梅里 | 108 | 公所自辦 |
| | | 富基里 | 109 | 公所自辦 |
| 23 | 八里區（3） | 長坑里 | 107 | 消防局 |
| | | 下罟里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 米倉里 | 109 | 自主型/消防局 |

| 序號 | 區 | 里 | 推動年度 | 推動單位 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 平溪區（4） | 薯榔里 | 105 | 農業局 |
| | | 南山里 | 107 | 自主型/消防局 |
| | | 嶺腳里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 新寮里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 25 | 雙溪區（6） | 魚行里 | 105 | 水利局 |
| | | 牡丹里 | 106 | 水利局 |
| | | 平林里 | 106 | 水利局 |
| | | 三港里 | 107 | 自主型/消防局 |
| | | 長源里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 外柑里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 26 | 貢寮區（4） | 福連里 | 105 | 農業局 |
| | | 仁里里 | 107 | 自主型/消防局 |
| | | 貢寮里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 龍崗里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 27 | 金山區（4） | 三界里 | 103 | 消防局 |
| | | 重和里 | 107 | 農業局 |
| | | 六股里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 萬壽里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 28 | 萬里區（3） | 中幅里 | 107 | 消防局 |
| | | 崁腳里 | 108 | 自主型/消防局 |
| | | 萬里里 | 109 | 自主型/消防局 |
| 29 | 烏來區（4） | 信賢里 | 105 | 消防局 |
| | | 烏來里（已取得認證） | 106 | 水利局 |
| | | | 108 | 區域治理/消防局 |
| | | | 109 | |
| | | 忠治里 | 106 | 原民局 |
| | | 福山里 | 107 | 原民局 |

# 二、防災社區遴選機制

- **由水利局、工務局、農業局、教育局、警察局、社會局、原民局及消防局共同遴選防災示範社區，並與協力團隊輔導社區(里)公所協助推動防災社區各項工作，促使防災工作在地化。**

**聯合遴選流程**

- 107年推動**13**處整合型防災社區及**16**處區公所自主型防災社區。
- 108年推動**5**處韌性社區、**7**處整合型防災社區、**28**處自主型防災社區及辦理**烏來區**各防災社區**聯合複訓**。
- 109年**持續推動108年5處韌性社區**、 **7**處整合型防災社區、**31**處自主型防災社區及辦理**烏來區**各防災社區**聯合複訓**。
- 110年推動**5**處韌性社區、**7**處整合型防災社區、**28**處自主型防災社區及辦理**烏來區**各防災社區**聯合複訓**。

# 二、防災社區遴選機制

- 110年防災社區名單

## 1.整合型

| 局處 | 區 | 里（或社區） |
|---|---|---|
| 水利局 | 樹林區 | 三龍里 |
| | 汐止區 | 保長里 |
| | 瑞芳區 | 龍安里 |
| 工務局 | 淡水區 | 翡冷翠社區 |
| 農業局 | 新莊區 | 雙鳳里 |
| | 瑞芳區 | 猴硐里 |
| 社會局 | 五股區 | 六福里 |
| 原民局 | 烏來區 | 聯合複訓 |

## 2.韌性社區

| 局處 | 區 | 里（或社區） |
|---|---|---|
| 消防局 | 中和區 | 碧河里 |
| | 新莊區 | 合鳳里 |
| | 八里區 | 荖阡里 |
| | 萬里區 | 北基里 |
| | 深坑區 | 昇高里 |

## 3.自主型

| 區 | 里 | 區 | 里 |
|---|---|---|---|
| 板橋區 | 僑中里 | 五股區 | 成德里 |
| 三重區 | 五華里 | 泰山區 | 新明里 |
| 中和區 | 中安里 | 林口區 | 東勢里 |
| 永和區 | 福和里 | 深坑區 | 萬福里 |
| 新莊區 | 萬安里 | 石碇區 | 永安里 |
| 新店區 | 中山里 | 坪林區 | 石(石曹)里 |
| 土城區 | 青山里 | 三芝區 | 新庄里 |
| 蘆洲區 | 永康里 | 石門區 | 石門里 |
| 樹林區 | 樹興里 | 八里區 | 大崁里 |
| 汐止區 | 自強里 | 平溪區 | 石底里 |
| 鶯歌區 | 中湖里 | 雙溪區 | 上林里 |
| 三峽區 | 添福里 | 貢寮區 | 真理里 |
| 淡水區 | 文化里 | 金山區 | 磺港里 |
| 瑞芳區 | 吉安里 | 萬里區 | 龜吼里 |

# 三、防災社區推動步驟

1.啟蒙與啟動

2.災害環境診斷與防救災對策研擬

3.防救災組織建立與防災計畫研擬

4.防救災技能訓練

5.外縣市防災社區參訪

6.防救災演練

7.年度成果展



圖片來源：網頁

# 三、防災社區推動步驟

## 1.啟蒙與啟動

- 透過啟蒙與啟動活動，以淺顯易懂的文字或示意圖
- 將複雜的專業知識或防救災資訊，轉換成居民容易吸收的常識
- 讓居民對社區所面臨的可能災害有基本的了解。

**向里民傳達防災社區的重要性**

**建立防災意識**

**提高參與意願**

# 三、防災社區推動步驟

## 2.災害環境診斷及防救災對策研擬

（自主型防災社區）

① 環境踏勘

1.專家學者帶領社區踏勘。
2.了解社區歷史災害、災害潛勢及其因素。

② 環境診斷地圖

利用社區航照圖、災害與社區資源照片等，製作環境診斷地圖。

③ 防救災對策研擬

1.設定災害議題。
2.以「家庭」和「社區」進行「災前、災中、災後」對策研擬。

# 三、防災社區推動步驟

## 3.防救災組織建立與防災計畫研擬 （自主型防災社區）

- 整合社區相關組織，建立防救災組織，並依組別規劃「減災、整備、應變」任務。
- 擬定符合社區需求的**防災計畫**

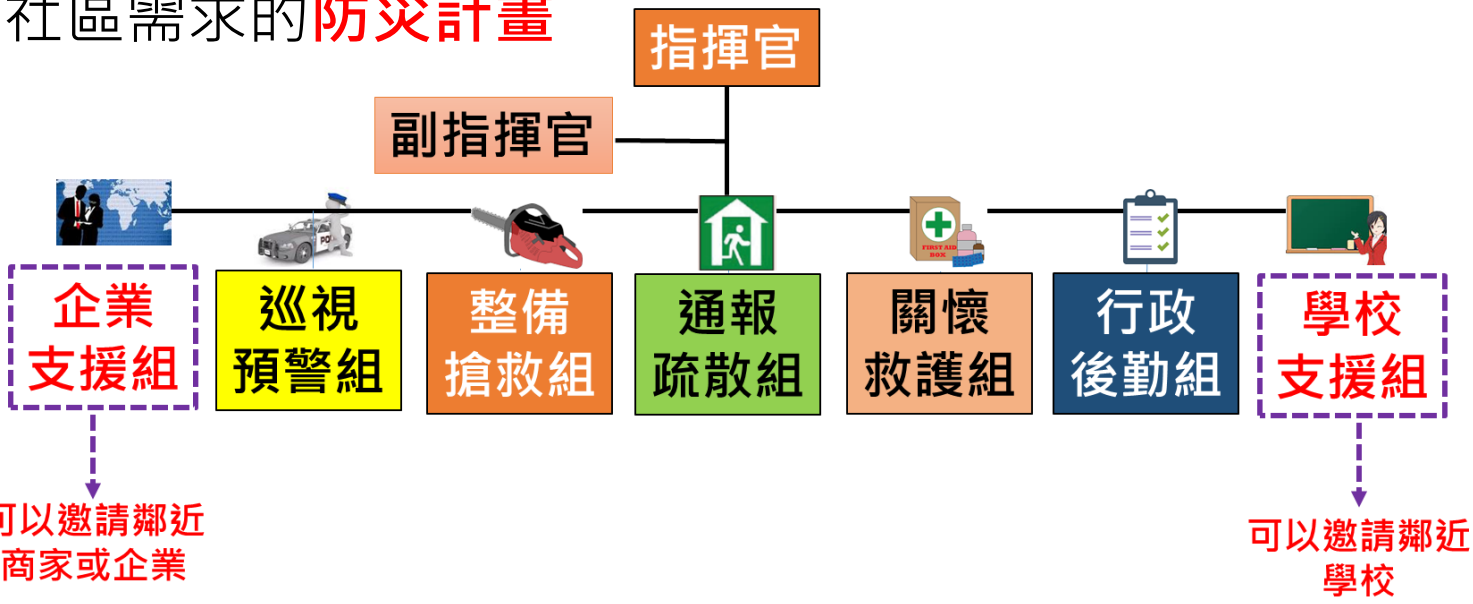


- 本年度辦理的課程需**納入核安教育訓練或宣導**(須以簡報方式呈現，將再提供參考資料)

# 三、防災社區推動步驟

## 4.防救災技能訓練 （自主型防災社區）

- **邀請**推動防災社區**轄區消防分隊**授課─消防知識課程（含滅火器操作說明及實作）、AED與CPR、哈母立克急救法，以及包紮救護與實作訓練。

# 三、防災社區推動步驟

## 5.社區參訪

- 透過參訪學習防災社區運作經驗，提供日後防災社區持續運作之重要參考。

# 三、防災社區推動步驟

## 6.防救災演練 （自主型防災社區）

- 依據社區實際狀況設定災害情境，由社區民眾進行實兵演練，讓社區熟稔災害發生前後之整備與應變。
- 社區日後**如擬申請韌性社區標章，建議演練前辦理防救災演練籌備會**，以及演練結束後於**當天或擇日召開演練後檢討報告**，以符合標章申請要件。

# 三、防災社區推動步驟

## 7.年度成果展 （自主型防災社區）

- 以防災社區歷次活動之照片及影片為素材，製作成果影片，讓參與民眾回味共同走過的路，並分享學習過程中的收獲。
- **可以接續於防救災演練後辦理**。

# 四、110年度辦理方式說明

有疑問時
怎麼辦？

防災社區輔導團

邀請講師

提供講師聯絡資訊給公所

公所於課前聯繫講師

協力團隊會提供諮詢

- 災害環境診斷與防救災對策研擬
- 防救災組織建立與防災計畫研擬
- 防救災技能訓練
- 防救災演練暨成果展

參考
新北市防災社區操作指南

# 貳、新北市防災社區認證說明

# 一、前言

## 1. 目的

(1) 透過防災社區之推動，使防救災能量扎根於社區。

(2) 降低災害發生機率或減少人命傷亡及財產損失。

(3) 藉由防災社區認證，維持防災社區之永續發展。

(4) 提升社區民眾對於自主防災社區之歸屬感與榮譽心。

## 2. 辦理機關

(1) 指導單位：新北市政府。

(2) 主辦單位：新北市政府消防局。

(3) 送審單位：新北市各區公所。

(4) 申請單位：里辦公處（社區）。

## 3. 認證對象

(1) 本府相關局處辦理之防災社區。

(2) 本市各區公所辦理之防災社區。

# 二、評選資料及評分標準

認證評選所需之資料及配分標準如下：

1. 社區災害環境診斷及對策研擬(18分)
2. 防救災資料庫建置(20分)
3. 社區防救災組織成立(15分)
4. 防救災技能訓練(15分)
5. 防救災演練(30分)
6. 附件(2分)

經評分**未達85分**者
**不予核發**防災社區認證標章及證書

# 二、評選資料及評分標準

## 1.社區災害環境診斷及對策研擬：

- **社區環境踏勘路線計畫**：規劃踏勘社區環境的路線、帶隊人員。
- **踏勘結果彙整**：踏勘結果及照片（含說明）。
- **防災地圖繪製**：社區環境診斷地圖製作紀錄，如照片（含說明）。
  - **注意事項：照片一定要有1張診斷地圖完成圖。**

- **防救災對策研擬**：包含研擬結果、照片（含說明）等。

| 踏勘路線 | 踏勘人員 |
|---|---|
| 從嘉慶里集會所出發→員山路143巷27、34弄→連城路456巷→中和高中 | 1. 吳永華里長帶領里民、中和區公所、新北市政府消防局威剛科技公司及協力團隊臺灣大學共同踏勘社區環境。<br>2. 中和高中柯雅菱校長帶領踏勘中和高中校園環境及設於校內的避難收容處所。 |

| 災害種類（踏勘結果） | 家庭對策 | 社區對策 |
|---|---|---|
| 火災（社區有許多狹小巷弄，容易造成救災困難） | 災前<br>1.因狹小巷弄遇災救災不易，平常要有共識將汽機車停放整齊，如果能取得里民同意增劃紅線。<br>2.狹小巷弄裡不要堆積雜物。<br>3.投保住宅綜合保險（火險及地震險）。<br>4.使用中的電線不要綑綁。<br>5.一定要安裝住宅警報器，並可準備滅火器（注意使用期限）。<br>6.家中裝設鐵窗者，如設有安全門，要將鑰匙放在固定地方，並時常演練開啟，以免鑰匙生銹致無法開啟<br>7.插座延長線不要同時使用插上太多的插頭<br>8.平常要多吸收防火知識。<br>9.平常要記得關瓦斯。<br>10.公寓頂樓的門不能上鎖。 | 災前<br>1.宣導不要違規停車，尤其是救災不易的狹小巷弄。<br>2.討論對於狹小巷弄的汽機車停車問題。<br>3.狹小巷弄不要隨意堆放雜物，如有堆積雜物，應隨時清除。<br>4.定期辦理防災講習及防救災演練。<br>5.大樓頂樓的門不能鎖住。<br>6.社區要準備滅火器。<br>7.成立防救災組織。<br>8.要注意社區的危險人物及具有危險性的容器，並隨時通報。<br>9.熟練防救災器材的使用。 |

# 二、評選資料及評分標準

## 2.防救災資料庫建置：

- **社區弱勢民眾（機構）調查**

  A. 弱勢民眾：保全戶、身心障礙、獨居長者及其他弱勢民眾及其緊急聯絡人等資料。

  B. 避難弱勢機構：含老人福利機構、身心障礙福利機構、護理之家及機構住宿式長期照顧福利機構及榮譽國民之家。

- **社區機具設備調查**：機具設備種類（含照片）、數量、狀況以及所有人或保管人之名冊等
  - 注意事項：機具設備照片需為實物照片，請勿提供網路圖片。

- **社區防救災人才調查**：如醫護人員、藥劑師、水電師傅、木工師傅、重機具駕駛、廚師、防災士、偵水志工及土石流防災專員等。
- **建置外部支援單位通訊名冊**：警察、消防、志工團體、學校及企業等。

# 二、評選資料及評分標準

## 3.社區防救災組織成立

- 防救災組織組別、參與人員名冊（含通訊錄）。
- 各編組組員（不含組長）至少2名以上。

## 4.防救災技能訓練：

- 防火知識、滅火器說明及實作。
- CPR
- AED急救法
- 哈姆立克法
- 包紮
  - 注意事項：提供認證之佐證資料必須含以上每項技能訓練之講師上課及實作照片至少各1張，共10張照片。

講師上課

民眾實作

# 二、評選資料及評分標準

## 5.防救災演練

- **演練計畫**：包含演練情境設定、腳本（應充分呈現各編組任務）、參演人員名單及演練場地規劃（含配置圖）等
  - 注意事項：編組組長僅報告整備事項不認定為執行任務。
- **演練成果**：辦理演練之紀錄，簽到表（註明編組組別）、成果照片（含說明）。
  - 注意事項：
    - 參與演練的各編組人員必須與社區編組成員相同。
    - 建議辦理演練籌備會，以供日後如擬申請韌性社區之佐證資料。

## 6.附件：歷次活動及課程教材。

# 三、認證流程

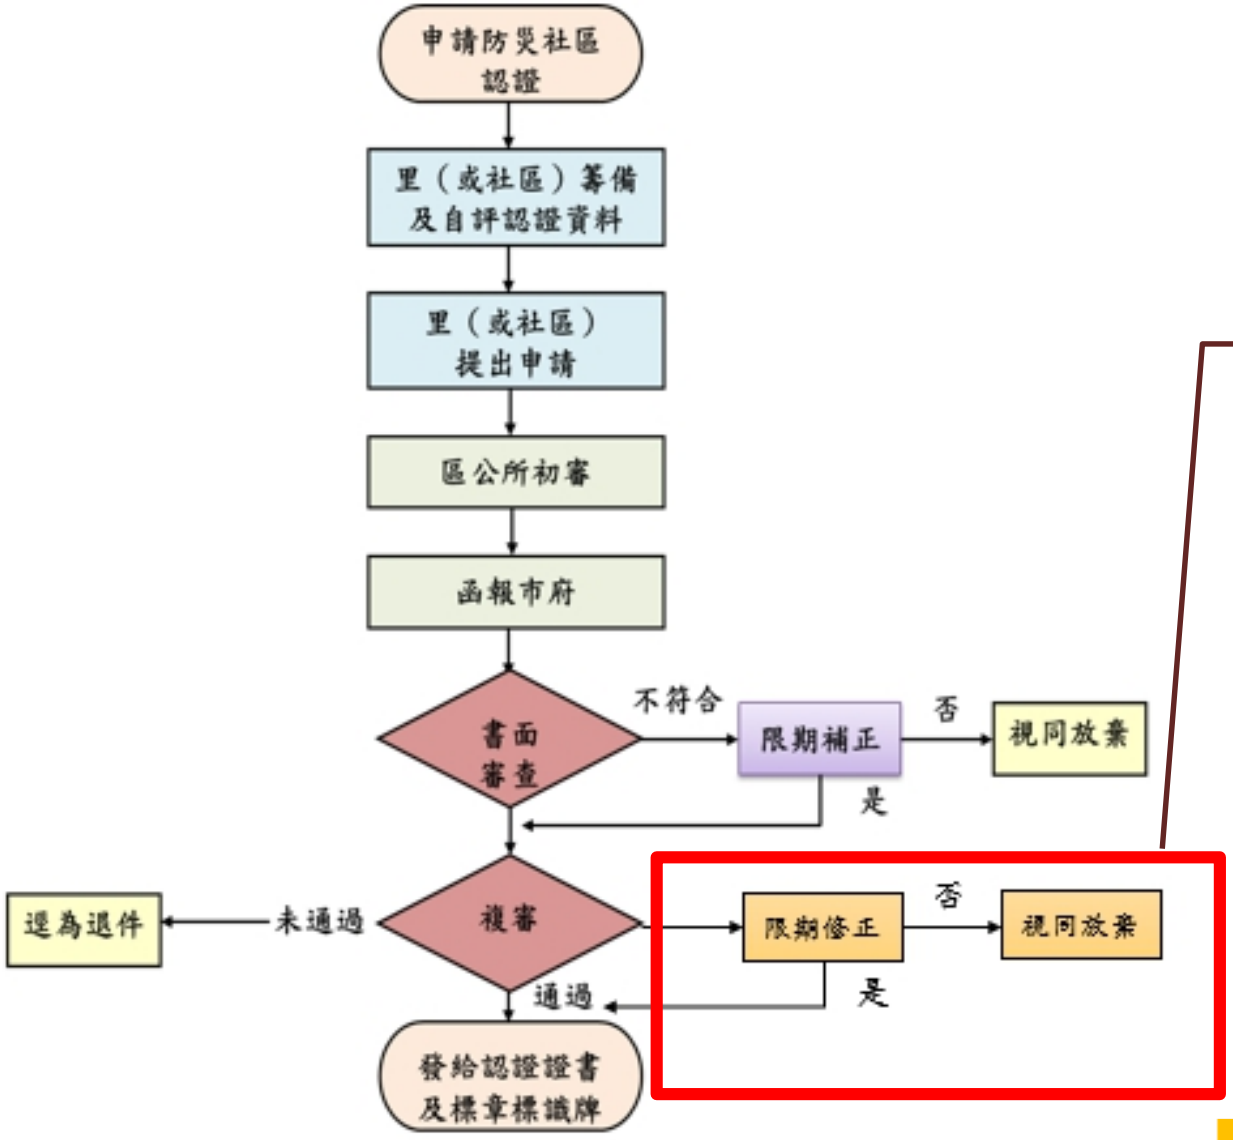


新增規定，必須依複審委員意見修正通過，才能取得新北市防災社區認證

# 四、推動及認證審查期程

| 序號 | 月份 | 辦理單位 | 工作事項 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-3 | 本府 | 召開防災社區推動暨認證說明會。 |
| 2 | 3-8 | 各區公所 | 各區公所推動自主型防災社區。 |
| 3 | 9 | 里辦公處 | 里辦公處（社區）彙整自評認證審查資料後，陳報區公所進行防災社區認證資料初審。 |
| 4 | 9 | 各區公所 | 區公所函報市府防災社區認證資料(含演練計畫)。 |
| 5 | 10 | 本府 | 本府進行防災社區認證資料書面審查。 |
| 6 | 11 | 本府 | ① 本府進行複審，必要時得進行實地查訪<br>② 依照複審委員建議修改資料完畢後，簽報核定及公布認證結果。 |
| 7 | 12 | 本府 | 頒發本市防災社區認證證書及標章（暫定於本市第4季災害防救會報）。 |

8月底前完成防災社區所有課程

# 五、防災社區標章及證書

■ 防災社區標章型式　● 防災社區標章標識牌　◆ 證書

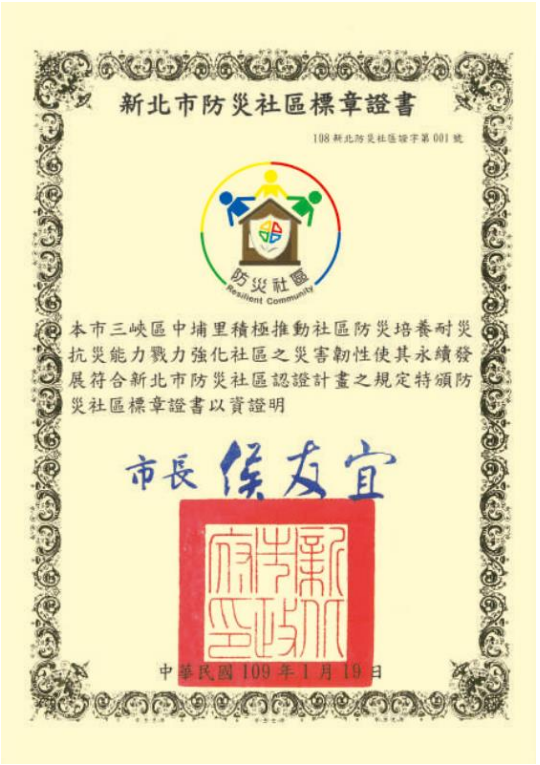

# 六、持續作為

## 1.參加防災社區複訓

- 每年皆需參加市府或區公所舉辦之防救災教育訓練，並應自主辦理防救災演練（兵推）、滾動式修正防救災資源資料庫，以及於實際災害啟動運作等，使社區防救災能量得以續存。

## 2.於災害事件期間啟動防救災組織運作

- 里辦公處（社區）應將災害事件期間之運作情形回報區公所，由區公所彙整後提報新北市政府備查。

三芝區古庄里防災（韌性）社區運作紀錄表

製表日期：109 年 8 月 2 日

| 事件/活動名稱：109.8.2 哈格比颱風 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 運作起訖（日期時間） | | | 地點（單一或多點） | 運作屬性（可複選） |
| | 日期 | 時間 | 1.古庄里卓新路<br>2.古庄里田寮路<br>3.古庄里活動中心 | ■平時減災<br>■災前整備<br>□災情查通報<br>□災情處置<br>□災後復原 |
| 起 | 109.8.2 | 10:30 | | |
| 迄 | 109.8.2 | 11:00 | | |

社區防救災運作情形說明

109 年 8 月 2 日上午 10 時 30 分左右，為因應哈格比颱風來襲，社區總指揮葉秋蓮里長，帶領防災社區組員進行災前準備事項說明如下：

1. 巡查清掃災害潛勢區道路卓新路及田寮路側溝清污，目前清除完畢。
2. 巡查活動中心外側圍籬是否牢固，提前做好防颱準備。
3. 經里長及巡視預警組，社區及及地方目前無災情發生。

葉里長與巡視預警成員
巡查清掃卓新路及側溝

葉里長與巡視預警組成員
颱風前巡查清掃卓新路

# 參、韌性社區推動說明

# 一、認識韌性社區

社區防災

基礎工作

執行

三元素

建立

復原重建共識

維持運作機制



資料來源：韌性社區操作手冊

# 二、推動韌性社區工作項目

| 面向 | 工作項目 |
| --- | --- |
| 面向一：<br>建立夥伴與合作關係 | 1-1建立社區防災組織並結合社區既有組織 |
| | 1-2派員參與防災士訓練 |
| | 1-3鼓勵社區民眾參與 |
| | 1-4調查與彙整參與民眾資料 |
| | 1-5結合其他單位與合作 |
| | 1-6宣導與推廣 |
| 面向二：評估社區潛在的災害風險 | 2-1提升社區災害防救概念及風險意識 |
| | 2-2辨識社區風險 |
| | 2-3歷史災害調查 |
| | 2-4潛勢分析 |
| 面向三：<br>擬定因應策略，排定順序並落實 | 3-1擬定社區防災計畫並落實 |
| | 3-2排定順序，落實社區防災計畫 |
| 面向四：<br>延續韌性社區推動工作 | 4-1研擬維持運作機制 |
| | 4-2建置推動記錄檔案 |
| | 4-3組成推動小組 |
| | 4-4申請標章 |
| | 4-5辦理經驗交流 |
| 面向五：<br>強化社區應變與復原重建能力 | 5-1辦理兵棋推演或實兵演練 |
| | 5-2擬定復原重建機制 |
| | 5-3補充應變所需裝備 |
| | 5-4 防救災技能訓練(增列) |



資料來源：內政部消防署

# 三、推動韌性社區活動

| 110年（第1年） | 110年（第2年） |
| --- | --- |
| 1.韌性社區工作團隊組成與指導會議 | 1.災前復原重建工作坊（預計2次）<br>■ 討論復原重建事項<br>■ 討論因應策略及措施擬定<br>■ 討論韌性社區維持運作機制 |
| 2.韌性社區啟蒙與啟動 | |
| 3.災害環境診斷與防救災對策研擬 | |
| 4.防救災組織建立與防災計畫研擬 | 2.韌性社區經驗交流 |
| 5.防救災技能訓練 | |
| 6.防救災實兵演練或兵棋推演<br>■ 第1年如為兵棋推演，則於第2年進行實兵演練） | |

資料來源：內政部消防署

# 三、推動韌性社區活動

## 復原重建工作事項（節錄林口區嘉寶里）

| 項次 | 狀況 | 順序 | | 執行方式及分工 | 支援事項<br>（含政府及外部單位） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里應變中心成立 | 短期 | 確認防救災組織人員安全及嘉寶里辦公處安全無虞後，於嘉寶里辦公處成立嘉寶里災害應變中心，展開防救災組織運作。 | (1)指揮官聯繫各組組長是否安全，並請各組確認組員安全。<br>(2)指揮官確認嘉寶里辦公處安全無虞。<br>(3)成立災害應變中心，韌性社區編組依災害實際狀況進行運作。 | 無。 |
| | | 中期 | 經評估以短期運作為主。 | 無。 | 無。 |
| | | 長期 | 無。 | 無。 | 無。 |
| 2 | 收容安置 | 短期 | (1)本里獨居長者有 1 位、身障者有 9 位，另里內有 7 家液化石油氣分裝廠，如遇地震時，分裝廠週遭住戶約有 33 人及嘉寶國小可能遭受影響最大，平時需加強宣導相關注意安全事項。<br>(2)收容於優先開設提供嘉寶里民收容避難的嘉寶國小。<br>(3)調查鄉親狀況，是依親或是暫時安置於避難收容處所。 | (1)避難收容處所由區公所負責開設，社區防救災組織居於協助角色，如協助報到、物資盤點等。<br>(2)在安全前提下，由巡視預警組確認里內受災狀況，並由關懷救護組關懷里內受災民眾，如有收容必要，先行確認是否依親，或前往避難收容處所暫時避難。<br>(3)避難收容處所開設期間，社區防救災組織由指揮官調度輪流前往避難收容處所協助。 | (1)民生物資由公所平日貯備物資或是由開口合約廠商供應，當災區災民缺乏大量民生必需品，亦可向企業防災合作夥伴尋求協助。<br>(2)若確定無法透過前述管道籌措供應時，由新北市政府社會局統或區公所籌透過媒體（如電視、地區第四臺、廣播業者等）緊急發布賑災訊息，呼籲民間善心人士捐助受難災民。 |
| | | 中期 | (1)協調竹林山觀音寺提供香客大樓。<br>(2)協調八里國際高爾夫球場提供 | (1)指揮官協調竹林山觀音寺或八里國際高爾夫球場。<br>(2)行政後勤組調查里內受災民眾 | (1)由新北市政府城鄉發展局及區公所輔導及協助社區復原重建組織進行規劃。 |

# 三、推動韌性社區活動

## 韌性社區維持運作事項（節錄林口區嘉寶里）

| 項次 | 工作項目 | 負責及協同（人、單位） | 監督單位及人員 | 說明 | 經費來源 | 1-3個月 | 4-6個月 | 7-9個月 | 10-12個月 | 13-15個月 | 16-18個月 | 19-21個月 | 22-24個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 持續參與防災（韌性）社區及防救災教育訓練課程 | ■ 指揮官<br>■ 行政後勤組<br>■ 林口區公所 | 里辦公處 | (1) 配合林口區公所辦理期程，持續參與防災（韌性）社區及防救災教育訓練。<br>(2) 由行政後勤組製作課程紀錄。 | ■ 林口區公所 | | | | | | | | |
| 2 | 防救災技能訓練 | ■ 指揮官<br>■ 副指揮官<br>■ 行政後勤組<br>■ 新北市政府消防局第二大隊文化分隊<br>■ 嘉寶國小 | 里辦公處 | (1) 訓練項目包括：防火知識、滅火器操作、CPR（含嬰幼兒）、AED、哈姆立克、簡易包紮、防震知識，以及液化石油氣分裝場安全維護之說明等。<br>(2) 指揮官邀請新北市政府第二大隊文化分隊授課。<br>(3) 配合嘉寶國小辦理期程，參加防救災技能訓練。<br>(4) 行政後勤組製作紀錄。 | ■ 里辦公處<br>■ 新北市政府消防局第二大隊文化分隊 | | | | | | | | |
| 3 | 辦理防救災兵推及檢討 | ■ 指揮官<br>■ 防災士<br>■ 行政後勤組<br>■ 林口區公所 | 里辦公處 | (1) 由指揮官或防災士主導，召集各組組長及專業人士討論演演練狀況及相關事項，並於兵推後檢視社區整備資源是否足夠。<br>(2) 林口區公所提供協助。 | ■ 里辦公處<br>■ 林口區公所 | | | | | | | | |

# 四、韌性社區防災計畫書架構

## 防災計畫大綱

自主型防災社區
撰寫
第一章～第四章

第一章 計畫概述及目的
第二章 社區環境背景
- 第一節 社區圍範、地理環境及概況描述
- 第二節 社會環境概況

第三章 災害潛勢分析
- 第一節 歷史災害調查
- 第二節 災害潛勢及風險評估分析

第四章 建立夥伴關係、分工及職責
- 第一節 參與民眾及社區組織清冊
- 第二節 社區其他合作單位
- 第三節 社區災害防救組織權責分工

第五章 資源整備與管理
- 第一節 資源整備盤點結果
  - 壹、重要公共設施調查
  - 貳、現在防救災相關物資調查
  - 參、避難收容處所調查
  - 肆、社區企業調查
- 第二節 資源需求分析

第六章 災害防救工作與運作機制
- 第一節 減災與整備工作
- 第二節 應變工作
- 第三節 復原重建工作

第七章 因應策略及措施擬定
第八章 維持運作機制與經費說明

# 五、韌性社區認證申請

## 標章申請流程

推動24個月

深耕3期之社區

其他部會自主辦理之社區

直轄市、縣(市)提報韌性社區清冊

消防署提供社區災害防救深耕資訊網帳號密碼

直轄市、縣(市)提報韌性社區申請表及佐證資料

辦理書面審查

視情況實地訪視社區

內政部或民間防災審查輔導機構審核

通過

頒發韌性社區1星標章

1星標章

不通過

依照審核結果，補足資料或工作項目

韌性 Resilience

資料來源：內政部消防署

# 五、韌性社區認證申請

- ✓應劃定其範圍。
- ✓執行社區之災害防救工作應以**地震**作為基本災害類型，並增列在地性災害種類。
- ✓應於申請日期前二年內均有持續執行社區內災害防救工作、符合標章申請之工作項目，並提出佐證資料(標章申請表)。
- ✓應配合本部辦理韌性社區實地訪視作業。
- ✓社區應至少有**二名**實際居住於該社區人員依防災士培訓及認證管理要點參加培訓，取得**防災士**資格。

**應符合上述規定**

**韌性社區認證申請表**

| | |
|---|---|
| 一、基本資料 | _____縣/市_____社區<br>社區類型：□村/里 □社區發展協會 □大樓管理委員會 □其他：_____<br>社區範圍：_____路/街以北 _____路/街以南 _____路/街以東 _____路/街以西<br>（檢附範圍圖） |
| 二、運作時間 | _____年_____月至_____年_____月 |
| 三、申請標章 | □1 星標章 □2 星標章 □3 星標章 |

四、佐證資料

| 標章 | 工作項目 | 佐證資料名稱（填寫並檢附） |
|---|---|---|
| 1 星 | 1-1 建立社區防災組織並結合社區既有組織 | |
| | 1-2 派員防災士訓練 | |
| | 2-1 提升社區災害防救概念及風險意識 | |
| | 2-2 辨識社區風險 | |
| | 3-1 擬定社區防災計畫並落實 | |
| | 4-1 研擬維持運作機制 | |
| | 5-1 辦理兵棋推演或實兵演練 | |
| | 5-2 擬定復原重建機制 | |
| | 5-3 補充應變所需裝備 | |
| 2、3 星 | 確實依社區防災計畫執行維持運作機制 | |
| | 工作項目 1 | |
| | 工作項目 2 | |
| | 工作項目 3 | |
| | （韌性社區得自行增列） | |

| | |
|---|---|
| 五、備註 | |

資料來源：韌性社區操作手冊

# 六、區公所及社區配合說明

## 區公所

1.結合(發函)社區轄內其他單位共同推動，如警消單位、學校、志工團體、避難弱勢機構、企業等

林口區嘉寶國小

企業支援

2.地方媒體露出

地方媒體報導

# 六、區公所及社區配合說明

## 區公所

3.本年度辦理的課程需納入核安教育訓練或宣導(須以簡報方式呈現，將再提供參考資料)

# 六、區公所及社區配合說明

## 社區

1.防災不分性別

2.記錄災害事件期間韌性社區**實際運作事項**

**運作記錄表**

三重區田中里防災(韌性)社區運作紀錄表

製表日期：109 年 08 月 02 日

| 事件/活動名稱：1090802 哈格比颱風 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 運作起訖(日期時間) | | | 地點(單一或多點) | 運作屬性(可複選) |
| | 日期 | 時間 | 1. 三民公園<br>2. 三民公園外圍<br>3. 忠孝路 3 段 | ■平時減災<br>■災前整備<br>■災情查通報<br>■災情處置<br>□災後復原 |
| 起 | 109/08/02 | 21:30 | | |
| 迄 | 109/08/02 | 22:30 | | |
| 社區防救災運作情形說明 | | | | |
| 1.109 年 8 月 2 日哈格比颱風海上警報，指揮官里長詹貴洪與防災社區成員於三民公園召開防颱整備會議並進行里內巡查。<br>2 忠孝路三段周邊排水溝。<br>3. 忠孝路三段主要道路排水溝。 | | | | |

指揮官詹貴洪里長召集防災社區成員,召開防颱整備會議

巡查忠孝路三段排水溝

3.韌性社區LINE群組**資訊接收與傳遞**

# 六、區公所及社區配合說明

## 社區

4.推動期程為24個月。

5.配合推派2名社區人員參與防災士培訓。

# 八、臨時動議

# 九、主席結論
